


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-007 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO AV. JUÁREZ A CALLE ROMO DE VIVAR

Ubicación: FRACC. LOS LIRIOS
Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021
Programa: SD ALCANTARILLADO,
Subprograma: 01 REHABILITACIÓN
Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contrato: FISMDF 005-006/2021
Contratista: URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
Inicio Vigente: lunes, 14 de junio de 2021
Días de Obra: 45 días
Inicio Real: lunes, 14 de junio de 2021
Monto Contratado: \$1,057,984.90
Fin Vigente: miércoles, 28 de julio de 2021
Monto Ejercido:
Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/05/2021	5.20%	8.00%	50.0%
2	28/05/2021	12.80%	15.00%	50.0%
3	04/06/2021	25.80%	32.00%	50.0%
4	11/06/2021	41.16%		
5	18/06/2021	66.38%		
6	25/06/2021	89.78%		
7	02/07/2021	100.00%		

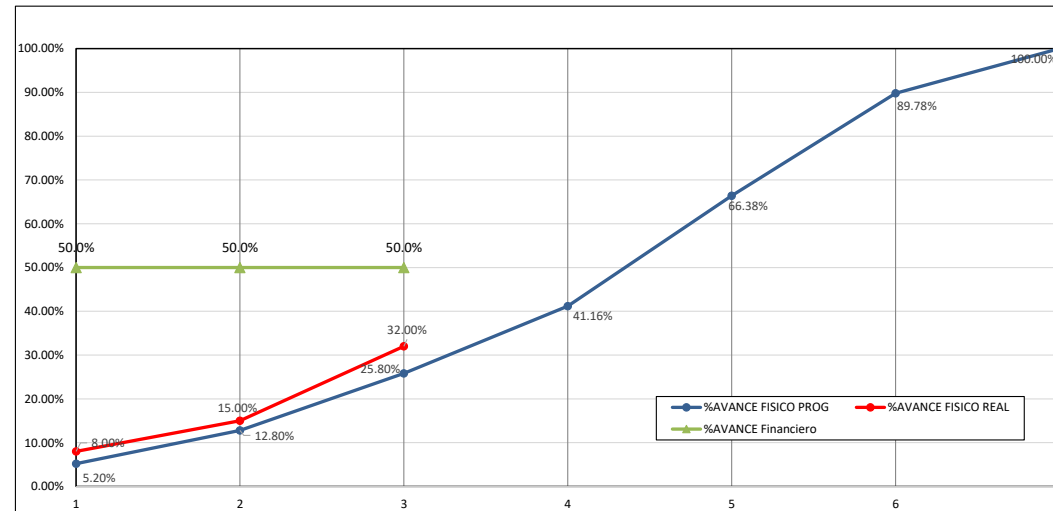

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
