

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FISMDF 11-008 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES TRAMO AV. JUÁREZ A CALLE ROMO DE VIVAR  
 FISMDF 11-013 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PRIVADA LÁZARO CARDENAS  
 FISMDF 11-014 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, PRIVADA LÁZARO CARDENAS  
 FISMDF 11-015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA LÁZARO CARDENAS, LORETITO, S.F.R.  
 FISMDF 11-016 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EZQUIJO RAMÍREZ TRAMO CALLE GUADALUPE MELENDEZ A CALLE GUADALUPE VICTORIA  
 FISMDF 11-017 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CALLE EZQUIJO RAMÍREZ TRAMO CALLE GUADALUPE MELENDEZ A CALLE GUADALUPE VICTORIA

**Ubicación:** LORETITO Y FRACC LIRIOS **Contrato:** FISMDF 008-013 a 017/2021

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021 **Contratista:** MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.


**Programa:** SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE **Inicio Vigente:** lunes, 14 de junio de 2021 **Días de Obra:** 45 días

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN **Inicio Real:** lunes, 14 de junio de 2021 **Monto Contratado:** \$1,488,439.03

**Residente:** ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** miércoles, 28 de julio de 2021 **Monto Ejercido:**

**Fin Real:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2021	1.80%	2.80%	50.0%
2	28/06/2021	7.64%	9.12%	50.0%
3	05/07/2021	23.11%		
4	12/07/2021	41.15%		
5	19/07/2021	68.32%		
6	26/07/2021	86.82%		
7	02/08/2021	100.00%		

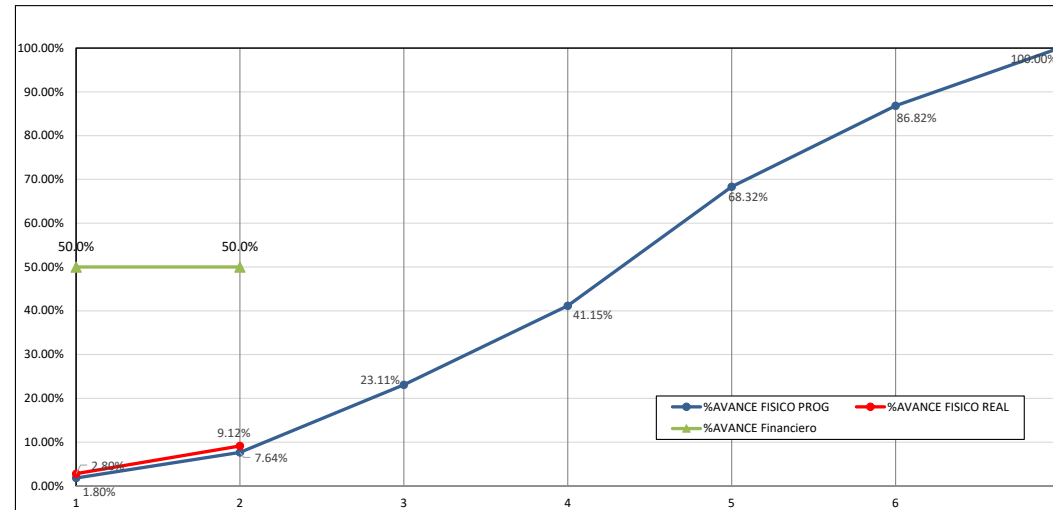

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
