

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-009 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RÍO SAN PEDRO
 FISMDF 11-010 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RÍO SAN PEDRO

Ubicación: FRACC. LOS LIRIOS

Contrato: FISMDF 009-010/2021

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: lunes, 21 de junio de 2021

Días de Obra: 45 días

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: lunes, 21 de junio de 2021

Monto Contratado: \$1,055,341.37


Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Fin Vigente: miércoles, 4 de agosto de 2021

Monto Ejercido:

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1				
2	07/01/1900	7.64%		
3	14/01/1900	23.11%		
4	21/01/1900	41.15%		
5	28/01/1900	68.32%		
6	04/02/1900	86.82%		
7	11/02/1900	100.00%		

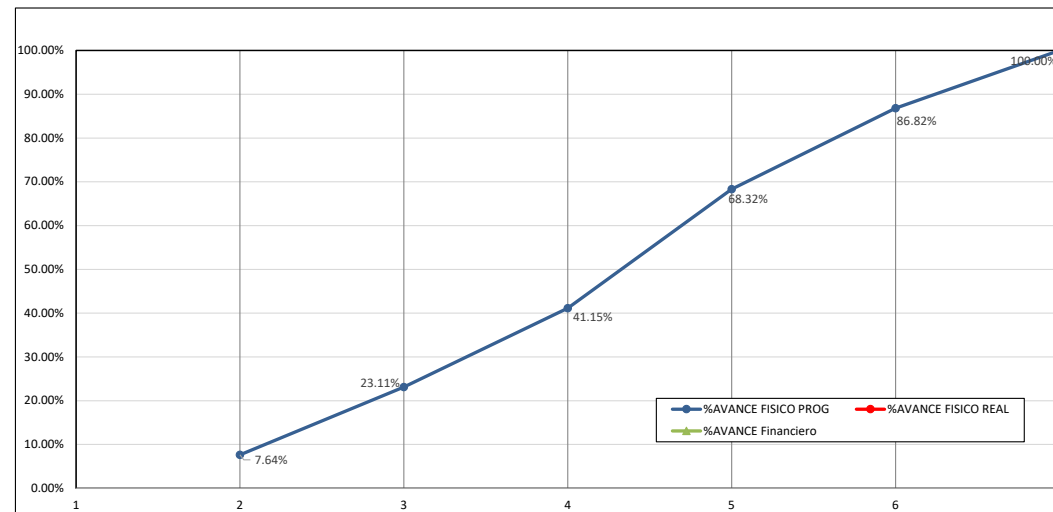

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
