

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-011 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN I CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ NUÑEZ
 FISMDF 11-012 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN II CALLE PROL. LÁZARO CARDENAS

Ubicación: LORETITO

Contrato: FISMDF 011-012/2021

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

Contratista: ELECTRICA AMCO, S. DE R.L. DE C.V.

Programa: SG ELECTRIFICACIÓN

Inicio Vigente: jueves, 24 de junio de 2021

Días de Obra: 45 días

Subprograma: 02 b) RURAL - AMPLIACIÓN

Inicio Real: jueves, 24 de junio de 2021

Monto Contratado: \$1,464,897.03


Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Fin Vigente: sábado, 7 de agosto de 2021

Monto Ejercido:

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/06/2021	1.20%	1.90%	50.00%
2	05/07/2021	12.88%		
3	12/07/2021	24.05%		
4	19/07/2021	47.84%		
5	26/07/2021	67.50%		
6	02/08/2021	88.14%		
7	09/08/2021	100.00%		

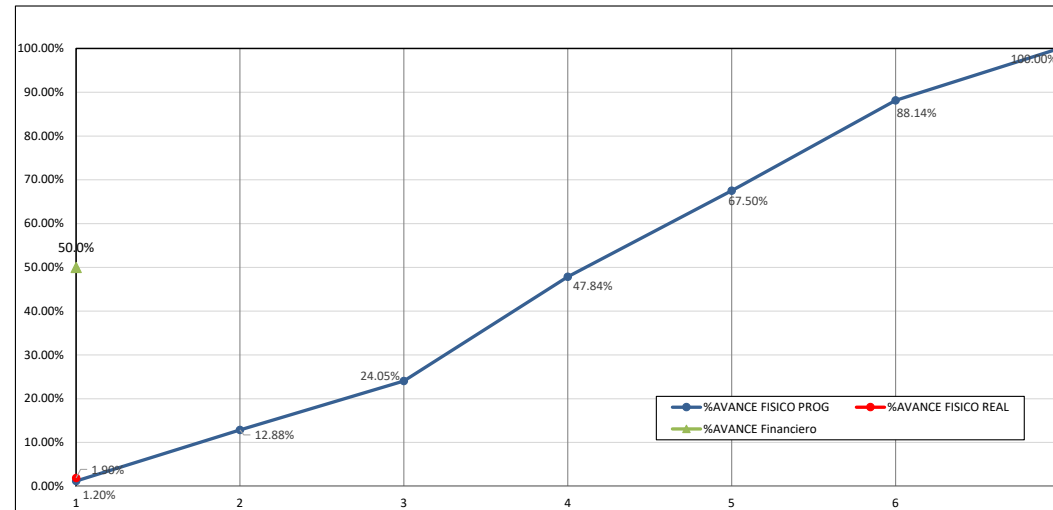

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
