

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FIS MDF 11-022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LÁZARO CARDENAS

**Ubicación:** LORETITO

**Contrato:** FIS MDF 022/2021

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

**Contratista:** LEOPOLDO MORONES FONSECA, TEC. MANT. IND

**Programa:** SF, SE PAVIMENTO EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN

**Inicio Vigente:** martes, 22 de junio de 2021

**Días de Obra:** 45 días

**Subprograma:** 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

**Inicio Real:** martes, 22 de junio de 2021

**Monto Contratado:** \$1,370,651.78


**Residente:** ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

**Fin Vigente:** jueves, 5 de agosto de 2021

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/08/2021	2.78%	4.20%	50.00%
2	04/09/2021	8.88%		
3	11/09/2021	18.75%		
4	18/09/2021	37.42%		
5	25/09/2021	56.60%		
6	02/10/2021	79.28%		
7	09/10/2021	100.00%		

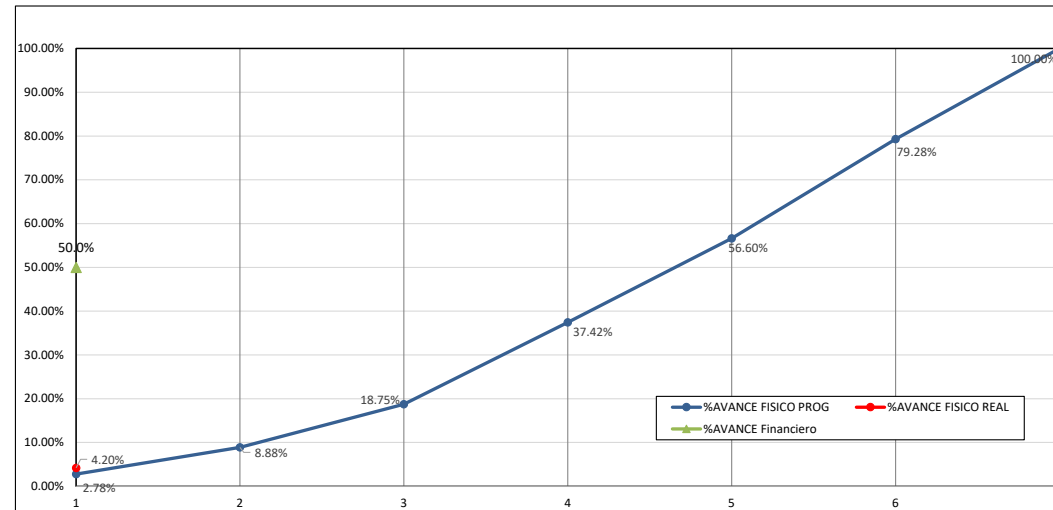

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
