

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-023 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN III CALLE: ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE JOSÉ ARTEAGA Y CALLE FAROL,
FISMDF 11-026 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN IV ACCESO A RANCHO NUEVO Y TURQUESA PONIENTE

Ubicación: MACARIO J. GÓMEZ y RANCHO NUEVO

Contrato: FISMDF 023-026/2021

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

Contratista: ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Programa: SG ELECTRIFICACIÓN

Inicio Vigente: martes, 15 de junio de 2021

Días de Obra: 45 días

Subprograma: 02 b) RURAL - AMPLIACIÓN

Inicio Real: martes, 15 de junio de 2021

Monto Contratado: \$1,106,109.52


Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Fin Vigente: jueves, 29 de julio de 2021

Monto Ejercido:

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2021	10.05%	12.00%	50.0%
2	28/06/2021	20.12%	25.00%	50.0%
3	05/07/2021	31.80%		
4	12/07/2021	56.33%		
5	19/07/2021	72.50%		
6	26/07/2021	88.00%		
7	02/08/2021	100.00%		

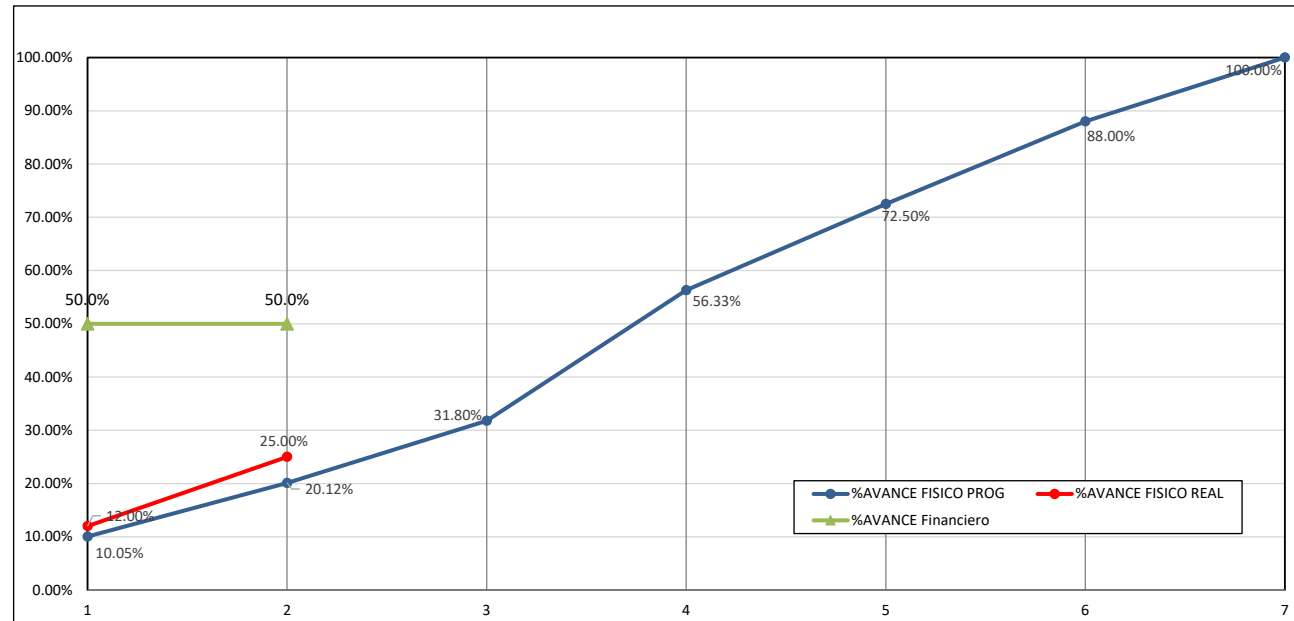

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
