

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFR 003/2021 REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE PASEOS DE LA PROVIDENCIA

Ubicación: FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2020

Programa: SE URBANIZACIÓN

Subprograma: 07 a) PARQUES PÚBLICOS Y RECREATIVOS – REHABILITACIÓN

Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: PFR 003/2021

Contratista: SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALES ROOT, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: viernes, 28 de mayo de 2021

Inicio Real: viernes, 28 de mayo de 2021

Fin Vigente: domingo, 11 de julio de 2021


Fin Real:

Días de Obra: 45 días

Monto Contratado: \$ 611,220.00

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/05/2021	1.50%	3.00%	49.1%
2	07/06/2021	22.80%	25.00%	49.1%
3	14/06/2021	35.05%	38.00%	49.1%
4	21/06/2021	44.23%	45.00%	49.1%
5	28/06/2021	62.51%	65.00%	76.2%
6	05/07/2021	89.33%		
7	12/07/2021	100.00%		

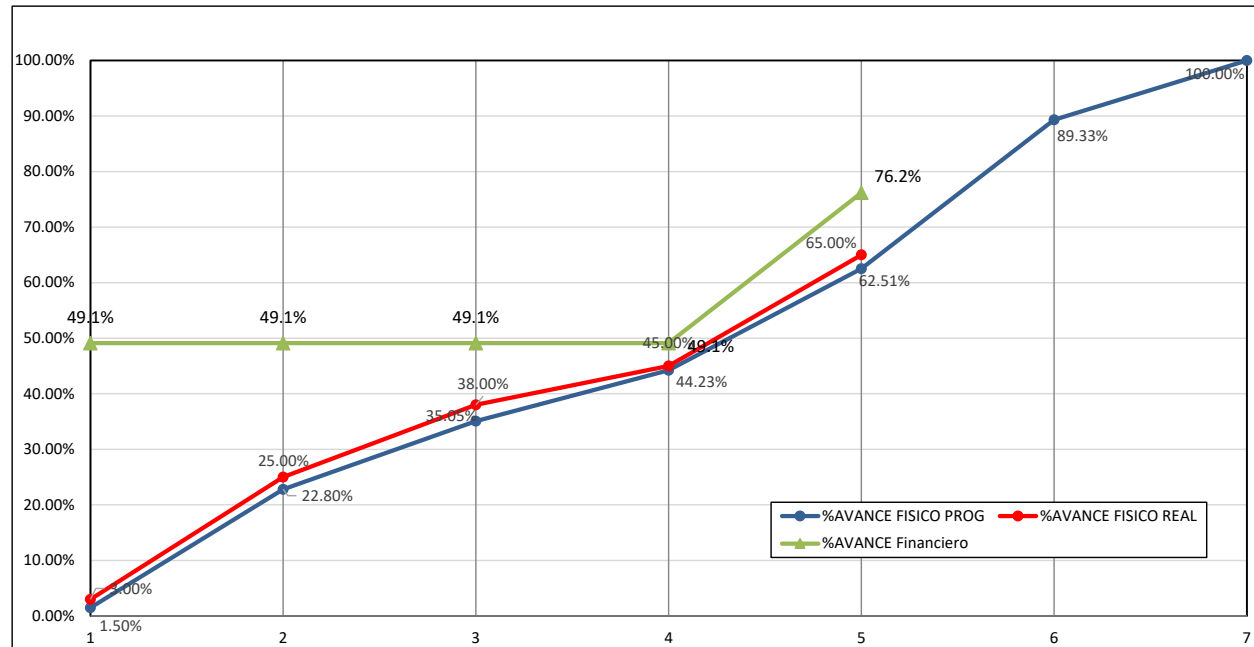

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
