

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PFR 004/2021 REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE RECREATIVO LORETITO

**Ubicación:** LORETITO

**Contrato:** PFR 004/2021

**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2020

**Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**Programa:** SE URBANIZACIÓN

**Inicio Vigente:** lunes, 24 de mayo de 2021

**Días de Obra:** 45 días

**Subprograma:** 07 a) PARQUES PÚBLICOS Y RECREATIVOS – REHABILITACIÓN

**Inicio Real:** lunes, 24 de mayo de 2021

**Monto Contratado:** \$ 1,479,110.00


**Residente:** ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

**Fin Vigente:** miércoles, 7 de julio de 2021

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/05/2021	9.09%	10.00%	49.1%
2	07/06/2021	25.87%	28.00%	49.1%
3	14/06/2021	41.41%	45.00%	57.6%
4	21/06/2021	55.76%	58.00%	57.6%
5	28/06/2021	68.37%	70.00%	76.2%
6	05/07/2021	92.16%		
7	12/07/2021	100.00%		

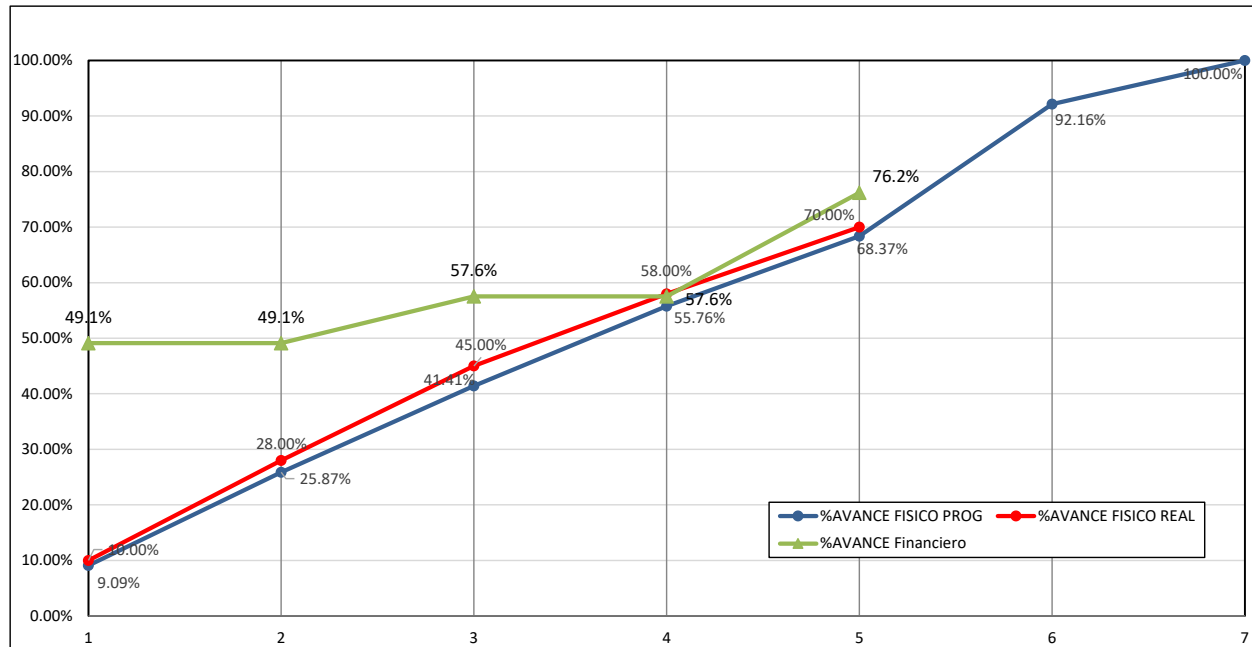

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
