

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 11-018 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CALLE EZIQUIO RAMIREZ A LAZARO CARDENAS
 FIS MDF 11-019 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CALLE EZIQUIO RAMIREZ A LAZARO CARDENAS

Ubicación: LORETITO

Contrato: FIS MDF 018-019/2021

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: lunes, 7 de junio de 2021

Días de Obra: 45 días

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: lunes, 7 de junio de 2021

Monto Contratado: \$629,108.47


Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Fin Vigente: miércoles, 21 de julio de 2021

Monto Ejercido:

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/06/2021	6.15%	7.50%	50.00%
2	21/06/2021	39.49%	42.80%	50.00%
3	28/06/2021	54.02%	55.20%	50.00%
4	05/07/2021	65.21%		
5	12/07/2021	80.02%		
6	19/07/2021	88.18%		
7	26/07/2021	100.00%		

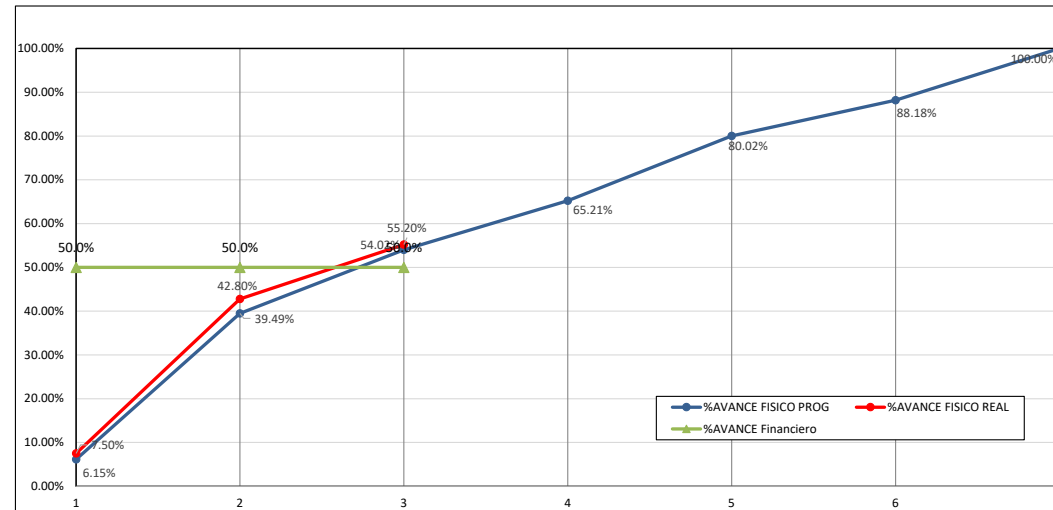

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
