

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FELIPE RODRIGUEZ, TRAMO AV. REBECA RODRIGUEZ RECIO A LA ESCUELA
 FISMDF 11-025 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FELIPE RODRIGUEZ, TRAMO AV. REBECA RODRIGUEZ RECIO A LA ESCUELA

Ubicación: VIÑEDOS RIBIER

Contrato: FISMDF 024-025/2021

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

Contratista: BENJAMIN MACIAS GASPAR

Programa: SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: lunes, 7 de junio de 2021

Días de Obra: 45 días

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: lunes, 7 de junio de 2021

Monto Contratado: \$462,246.61


Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Fin Vigente: miércoles, 21 de julio de 2021

Monto Ejercido:

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/06/2021	1.47%	2.50%	50.00%
2	21/06/2021	10.28%	12.80%	50.00%
3	28/06/2021	29.21%	32.50%	50.00%
4	05/07/2021	57.45%		
5	12/07/2021	79.76%		
6	19/07/2021	97.03%		
7	26/07/2021	100.00%		

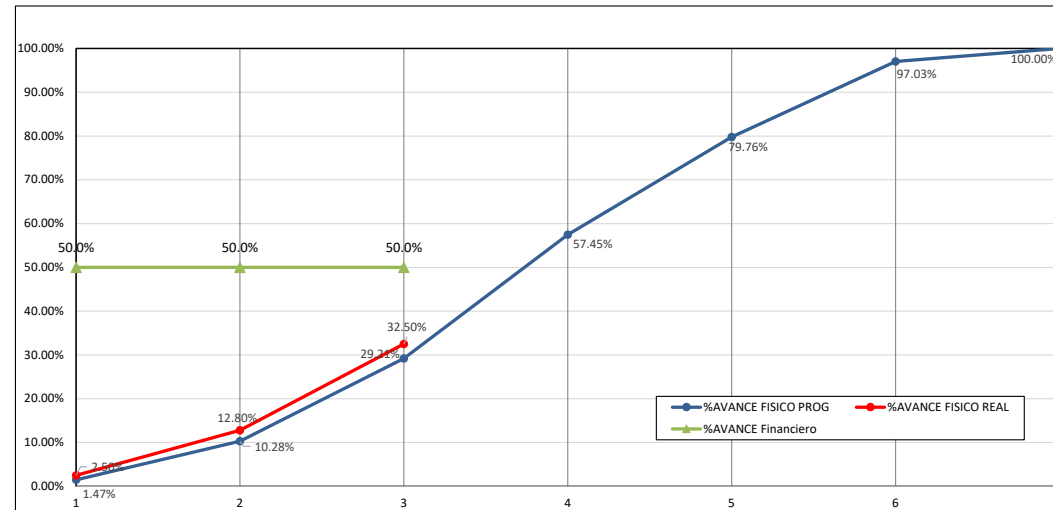

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
