

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** IP 001/21 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

**Ubicación:** TODO EL MUNICIPIO

**Contrato:** IP 001/21

**Tipo de inversión:** INGRESOS PROPIOS 2021

**Contratista:** Ing. Ángel de Jesús Ramírez Guardado

**Programa:** U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

**Inicio Vigente:** sábado, 13 de febrero de 2021

**Días de Obra:** -44240

**Subprograma:** 01, 03 ESTUDIOS Y PROYECTOS, SERVICIOS

**Inicio Real:** sábado, 13 de febrero de 2021

**Monto Contratado:** \$ 199,990.00


**Residente:**

**Fin Vigente:** jueves, 9 de diciembre de 2021

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/02/2021	33.41%	35.00%	0.0%
2	01/03/2021	34.78%	37.00%	0.0%
3	15/03/2021	36.15%	38.00%	0.0%
4	29/03/2021	42.00%	40.00%	0.0%
5	12/04/2021	43.37%	44.00%	0.0%
6	26/04/2021	44.74%	45.00%	0.0%
7	10/05/2021	46.11%	47.00%	0.0%
8	24/05/2021	50.00%	50.50%	0.0%
9	07/06/2021	51.37%	52.00%	0.0%
10	21/06/2021	52.74%	54.00%	0.0%
11	05/07/2021	54.11%		
12	19/07/2021	55.48%		
13	02/08/2021	56.85%		
14	16/08/2021	58.22%		
15	30/08/2021	59.59%		
16	13/09/2021	60.96%		
17	27/09/2021	62.33%		
18	11/10/2021	63.70%		
19	25/10/2021	65.07%		
20	08/11/2021	66.44%		
21	22/11/2021	72.00%		
22	06/12/2021	89.00%		
23	20/12/2021	100.00%		

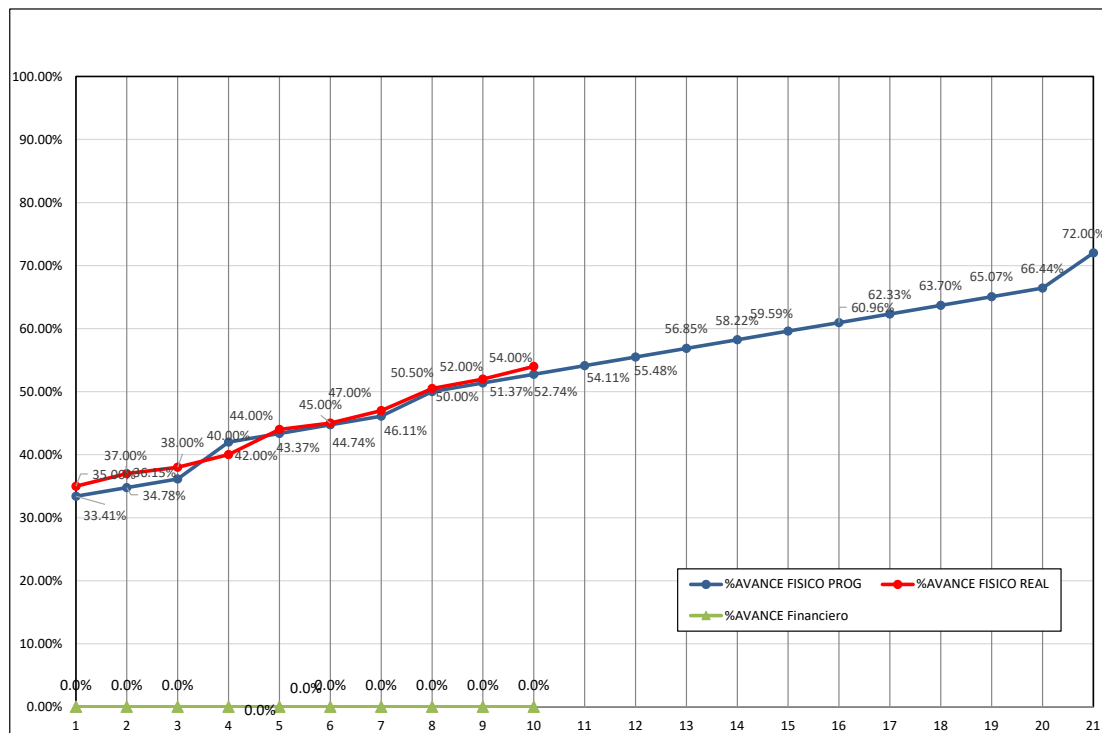

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
