

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFR 001/21 REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, UNIDAD DEPORTIVA FRACC. MIGUEL HIDALGO

Ubicación: FRACC. HIDALGO.- CABECERA MUNICIPAL

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2020

Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Subprograma: 02 b) CONSTRUCCIÓN - PRIMARIA

Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: PFR 001/2021

Contratista: CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ, I.C.

Inicio Vigente: viernes, 30 de abril de 2021

Inicio Real: viernes, 30 de abril de 2021

Fin Vigente: jueves, 20 de mayo de 2021


Fin Real: jueves, 20 de mayo de 2021

Días de Obra: 21 días

Monto Contratado: \$ 462,740.00

Monto Ejercido: \$ 462,740.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	03/05/2021	1.05%	2.50%	49.3%
2	10/05/2021	21.59%	25.00%	49.3%
3	17/05/2021	86.64%	89.00%	49.3%
4	24/05/2021	100.00%	100.00%	49.3%
5	31/05/2021	100.00%	100.00%	49.3%
6	07/06/2021	100.00%	100.00%	49.3%
7	14/06/2021	100.00%	100.00%	100.0%

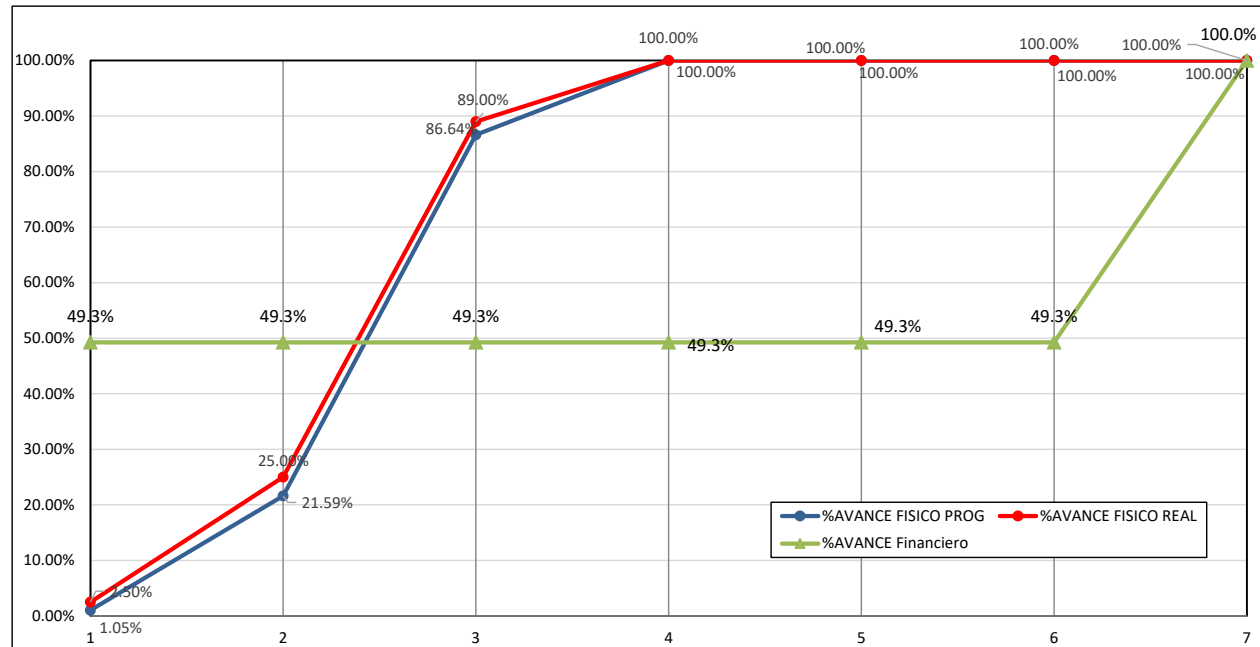

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
