


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FR 001/21 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EZQUIO RAMÍREZ,  
**Ubicación:** LORETITO **Contrato:** FR 001/2021  
**Tipo de inversión:** RESARCITORIO REMANENTE 2020 - RESARCITORIO 2021 **Contratista:** TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V.  
**Programa:** SF, SE PAVIMENTO EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN **Inicio Vigente:** miércoles, 18 de agosto de 2021 **Días de Obra:** 45 días  
**Subprograma:** 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** miércoles, 18 de agosto de 2021 **Monto Contratado:** \$ 1,156,620.87  
**Residente:** ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** sábado, 2 de octubre de 2021 **Monto Ejercido:**  
**Fin Real:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	23/08/2021	38.37%	44.00%	50.0%
2	06/09/2021	76.75%	85.00%	
3	20/09/2021	89.52%	92.00%	
4	04/10/2021	100.00%		

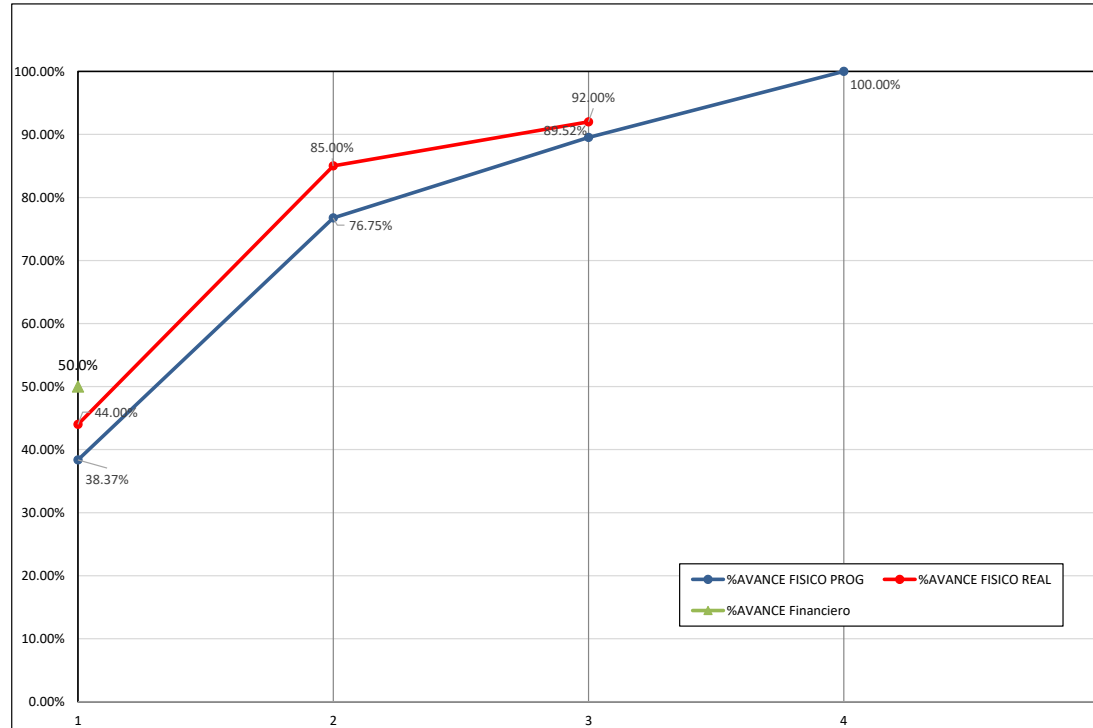

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
