


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FR 003/2021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FELIPE RODRIGUEZ,
Ubicación: VIÑEDOS RIBIER **Contrato:** FR 003/2021
Tipo de inversión: RESARCITORIO REMANENTE 2020 – RESARCITORIO 2021 **Contratista:** CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.,
Programa: SF, SE PAVIMENTO EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN **Inicio Vigente:** martes, 20 de julio de 2021 **Días de Obra:** 45 días
Subprograma: 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS **Inicio Real:** martes, 20 de julio de 2021 **Monto Contratado:** \$ 1,170,137.12
Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA **Fin Vigente:** jueves, 2 de septiembre de 2021 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	26/07/2021	7.52%	8.00%	50.0%
2	02/08/2021	25.65%	29.00%	50.0%
3	09/08/2021	37.57%	40.00%	50.0%
4	16/08/2021	57.60%	60.00%	50.0%
5	23/08/2021	71.74%	72.00%	87.9%
6	30/08/2021	85.87%	86.00%	87.9%
7	06/09/2021	100.00%	100.00%	87.9%
8	13/09/2021	100.00%	100.00%	87.9%
9	20/09/2021	100.00%	100.00%	87.9%
10	27/09/2021	100.00%	100.00%	87.9%
11	04/10/2021	100.00%	100.00%	

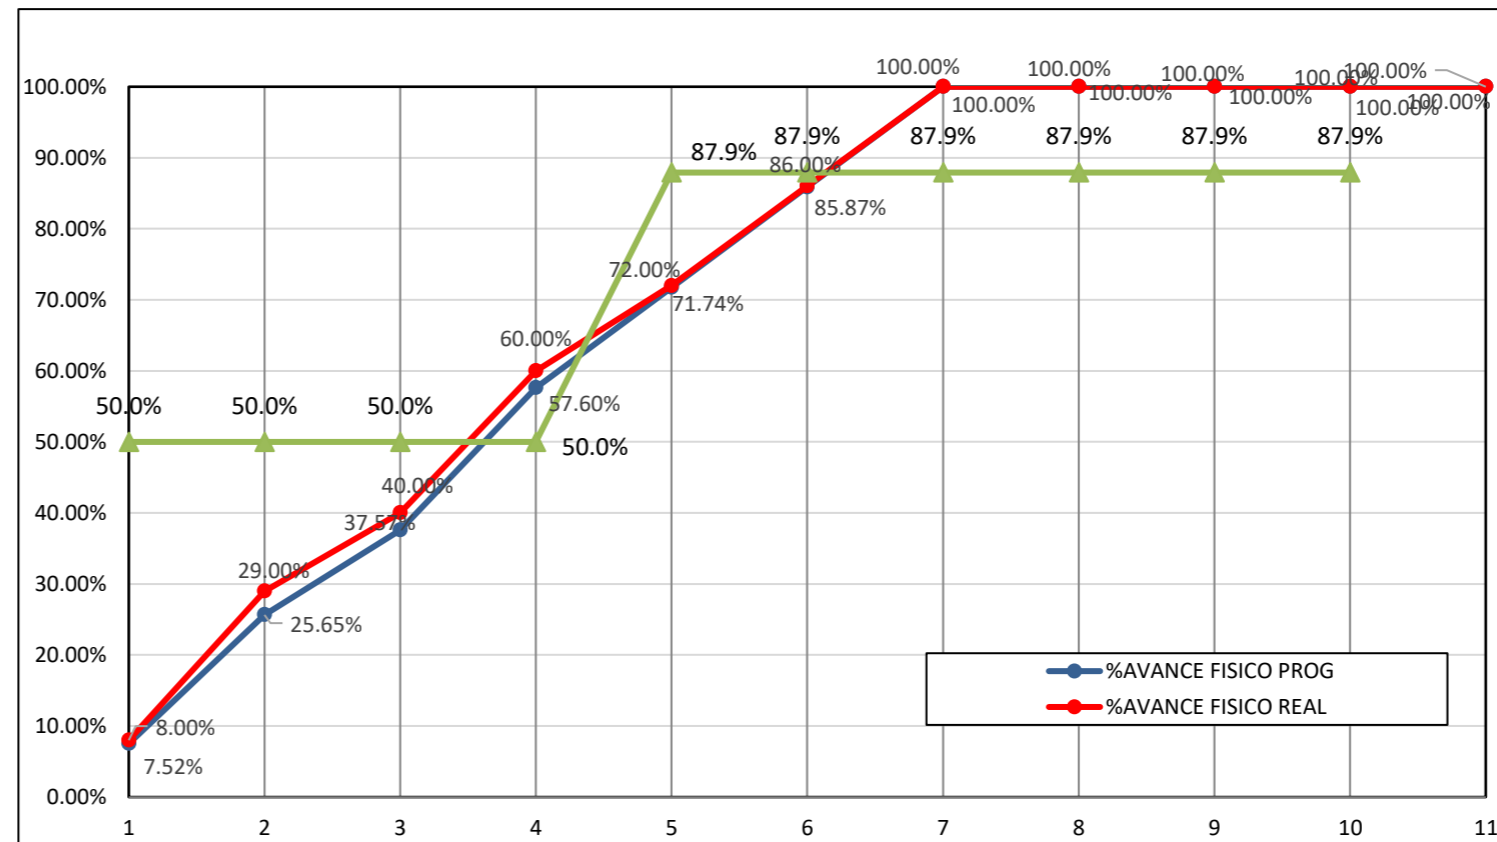

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
