

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FISMDF 11-001 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NIÑOS HEROES TRAMO CALLE MATAMOROS A CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ,  
FISMDF 11-002 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE NIÑOS HEROES TRAMO CALLE MATAMOROS A CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ

**Ubicación:** FRACC. LOS LIRIOS

**Contrato:** FISMDF 001-002/2021

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

**Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**Programa:** SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** lunes, 16 de agosto de 2021

**Días de Obra:** 45 días

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN

**Inicio Real:** lunes, 16 de agosto de 2021

**Monto Contratado:** \$1,072,940.00


**Residente:** T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**Fin Vigente:** miércoles, 29 de septiembre de 2021

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** miércoles, 29 de septiembre de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	23/08/2021	11.23%	14.00%	50.0%
2	30/08/2021	22.59%	26.00%	50.0%
3	06/09/2021	34.42%	36.00%	50.0%
4	13/09/2021	53.76%	60.00%	50.0%
5	20/09/2021	66.49%	77.20%	50.0%
6	27/09/2021	91.06%	95.00%	50.0%
7	04/10/2021	100.00%	100.00%	50.0%

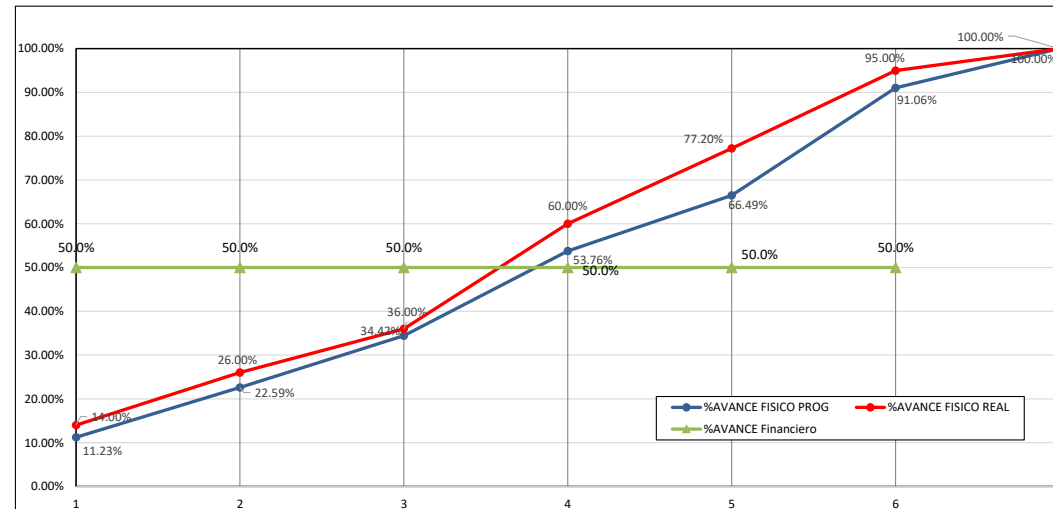

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
