

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FISMDF 11-003 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ Y CALLE MATAMOROS  
 FISMDF 11-004 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ Y CALLE MATAMOROS  
 FISMDF 11-020 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE LÁZARO CARDENAS, TRAMO CALLE GUADALUPE MELENDEZ A CALLE GUADALUPE VICTORIA  
 FISMDF 11-021 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE LÁZARO CARDENAS, TRAMO CALLE GUADALUPE MELENDEZ A CALLE GUADALUPE VICTORIA

**Ubicación:** COL. CENTRO CABECERA MUNICIPAL y LORETTITO,

**Contrato:** FISMDF 003-004 y 020-021/2021

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

**Contratista:** LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

**Programa:** SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** lunes, 19 de julio de 2021

**Días de Obra:** 45 días

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN

**Inicio Real:** lunes, 19 de julio de 2021

**Monto Contratado:** \$732,036.90


**Residente:** ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

**Fin Vigente:** miércoles, 1 de septiembre de 2021

**Monto Ejercido:** \$732,036.90

**Fin Real:** miércoles, 1 de septiembre de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	26/07/2021	0.99%	2.00%	48.9%
2	02/08/2021	7.64%	8.50%	48.9%
3	09/08/2021	23.11%	27.00%	48.9%
4	16/08/2021	41.15%	45.00%	48.9%
5	23/08/2021	68.32%	70.00%	48.9%
6	30/08/2021	86.82%	90.00%	48.9%
7	06/09/2021	100.00%	100.00%	54.9%
8	13/09/2021	100.00%	100.00%	54.9%
9	20/09/2021	100.00%	100.00%	54.9%
10	27/09/2021	100.00%	100.00%	54.9%
11	04/10/2021	100.00%	100.00%	

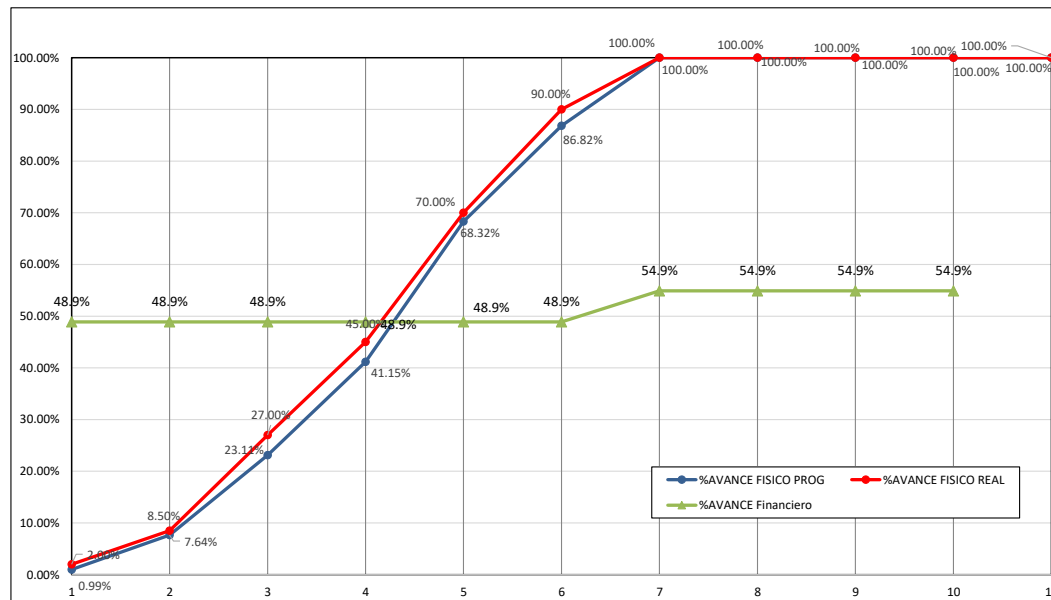

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
