

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FISMDF 11-005 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ROMO DE VIVAR, TRAMO CALLE MATAMOROS A CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ  
 FISMDF 11-006 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CALLE ROMO DE VIVAR, TRAMO CALLE MATAMOROS A CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ

**Ubicación:** FRACC. LOS LIRIOS

**Contrato:** FISMDF 005-006/2021

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

**Contratista:** CORACO, S.A. DE C.V.

**Programa:** SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** lunes, 21 de junio de 2021

**Días de Obra:** 45 días

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN

**Inicio Real:** lunes, 21 de junio de 2021

**Monto Contratado:** \$1,038,953.92


**Residente:** T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**Fin Vigente:** miércoles, 4 de agosto de 2021

**Monto Ejercido:** \$1,038,953.92

**Fin Real:** miércoles, 4 de agosto de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/06/2021	15.21%	18.00%	49.0%
2	05/07/2021	44.87%	50.00%	49.0%
3	12/07/2021	62.33%	64.00%	49.0%
4	19/07/2021	75.60%	78.00%	49.0%
5	26/07/2021	82.50%	88.00%	49.0%
6	02/08/2021	91.40%	95.00%	49.0%
7	09/08/2021	100.00%	100.00%	72.0%
8	16/08/2021	100.00%	100.00%	85.0%
9	23/08/2021	100.00%	100.00%	98.0%
10	30/08/2021	100.00%	100.00%	98.0%
11	06/09/2021	100.00%	100.00%	100.0%

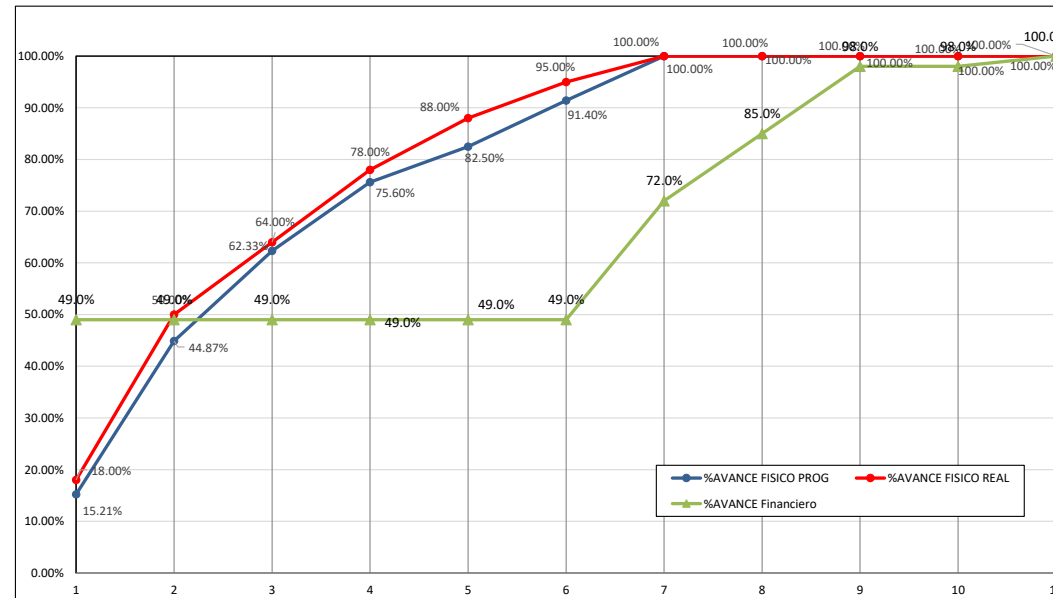

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
