


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 11-007 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES TRAMO AV. JUÁREZ A CALLE ROMO DE VIVAR

Ubicación: FRACC. LOS LIRIOS
Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021
Programa: SD ALCANTARILLADO
Subprograma: 01 REHABILITACIÓN
Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contrato: FIS MDF 007/2021
Contratista: URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
Inicio Vigente: lunes, 14 de junio de 2021
Días de Obra: 45 días
Inicio Real: lunes, 14 de junio de 2021
Monto Contratado: \$1,080,298.00
Fin Vigente: miércoles, 28 de julio de 2021
Monto Ejercido: \$1,080,298.00
Fin Real: miércoles, 28 de julio de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE FINANCIERO
1	19/06/2021	10.05%	11.00%	50.0%
2	26/06/2021	20%	22.00%	50.0%
3	03/07/2021	38.91%	40.20%	50.0%
4	10/07/2021	58.50%	62.00%	71.7%
5	17/07/2021	78.07%	80.00%	71.7%
6	24/07/2021	96.74%	98.00%	71.7%
7	31/07/2021	100.00%	100.00%	91.3%
8	07/08/2021	100.00%	100.00%	91.3%
9	14/08/2021	100.00%	100.00%	91.3%
10	21/08/2021	100.00%	100.00%	91.3%
11	28/08/2021	100.00%	100.00%	100.0%

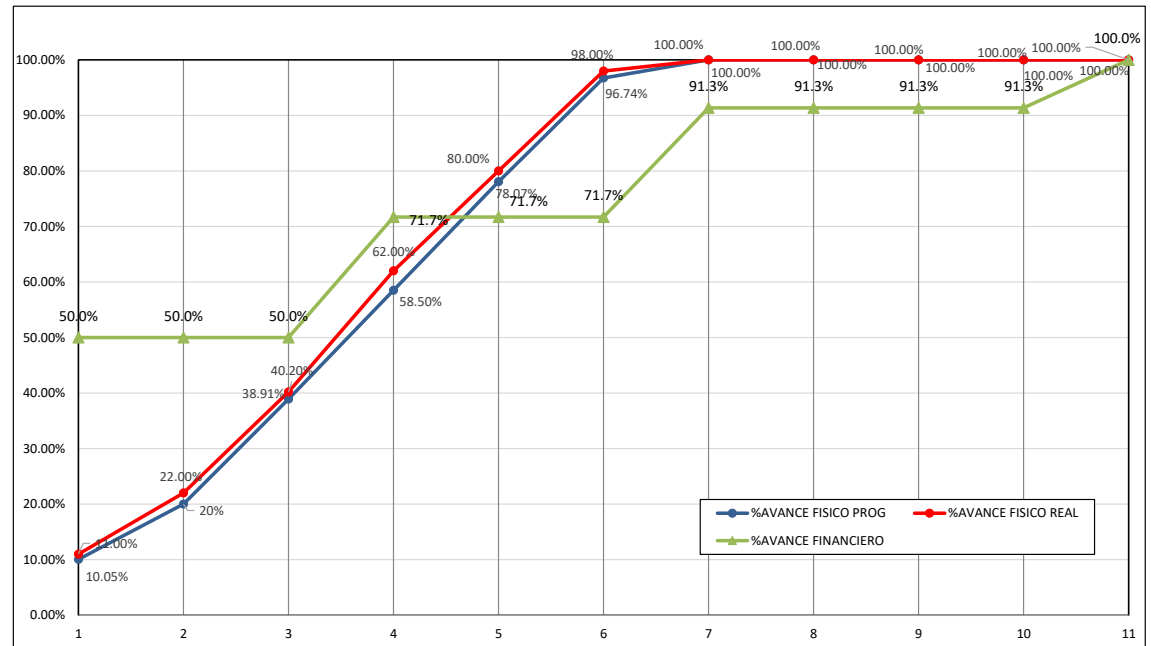

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
