

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-008 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES TRAMO AV. JUÁREZ A CALLE ROMO DE VIVAR
 FISMDF 11-013 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PRIVADA LÁZARO CARDENAS
 FISMDF 11-014 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, PRIVADA LÁZARO CARDENAS
 FISMDF 11-015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA LÁZARO CARDENAS, LORETITO, S.F.R.
 FISMDF 11-016 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EZQUIJO RAMÍREZ TRAMO CALLE GUADALUPE MELENDEZ A CALLE GUADALUPE VICTORIA
 FISMDF 11-017 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CALLE EZQUIJO RAMÍREZ TRAMO CALLE GUADALUPE MELENDEZ A CALLE GUADALUPE VICTORIA

Ubicación: LORETITO Y FRACC LIRIOS **Contrato:** FISMDF 008-013 a 017/2021

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021 **Contratista:** MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.


Programa: SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE **Inicio Vigente:** jueves, 8 de julio de 2021 **Días de Obra:** 45 días

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN **Inicio Real:** jueves, 8 de julio de 2021 **Monto Contratado:** \$1,520,721.00

Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** sábado, 21 de agosto de 2021 **Monto Ejercido:** \$1,520,721.00

Fin Real: sábado, 21 de agosto de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/07/2021	1.80%	2.80%	49.0%
2	19/07/2021	7.64%	9.00%	49.0%
3	26/07/2021	23.11%	25.00%	49.0%
4	02/08/2021	41.15%	44.00%	49.0%
5	09/08/2021	68.32%	68.32%	51.7%
6	16/08/2021	86.82%	86.82%	62.2%
7	23/08/2021	100.00%	100.00%	62.2%
8	30/08/2021	100.00%	100.00%	76.9%
9	06/09/2021	100.00%	100.00%	76.9%
10	13/09/2021	100.00%	100.00%	100.0%
11	20/09/2021	100.00%	100.00%	100.0%

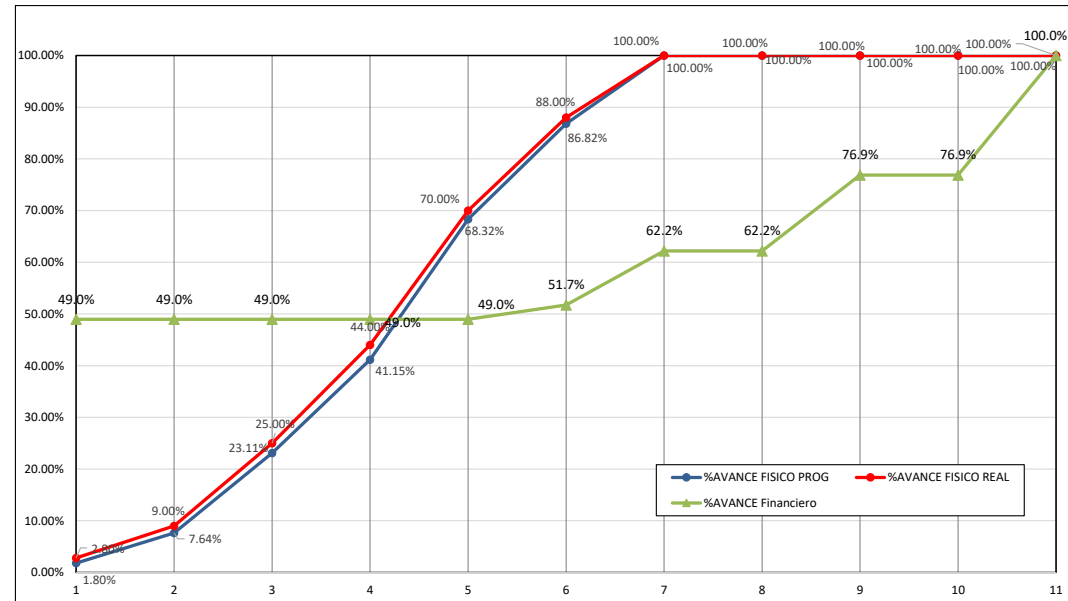

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
