

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 11-022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LÁZARO CARDENAS

Ubicación: LORETITO

Contrato: FIS MDF 022/2021

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

Contratista: LEOPOLDO MORONES FONSECA, TEC. MANT. IND

Programa: SF, SE PAVIMENTO EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN

Inicio Vigente: lunes, 16 de agosto de 2021

Días de Obra: 45 días

Subprograma: 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

Inicio Real: lunes, 16 de agosto de 2021

Monto Contratado: \$1,370,651.78


Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Fin Vigente: miércoles, 29 de septiembre de 2021

Monto Ejercido:

Fin Real: miércoles, 29 de septiembre de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	23/08/2021	2.78%	4.20%	48.8%
2	30/08/2021	8.88%	9.00%	48.8%
3	06/09/2021	18.75%	21.00%	48.8%
4	13/09/2021	37.42%	40.00%	48.8%
5	20/09/2021	56.60%	60.00%	48.8%
6	27/09/2021	79.28%	80.00%	48.8%
7	04/10/2021	100.00%	100.00%	48.8%
8	11/10/2021	100.00%	100.00%	48.8%
9	18/10/2021	100.00%	100.00%	48.8%
10	25/10/2021	100.00%	100.00%	48.8%
11	01/11/2021	100.00%	100.00%	100.0%

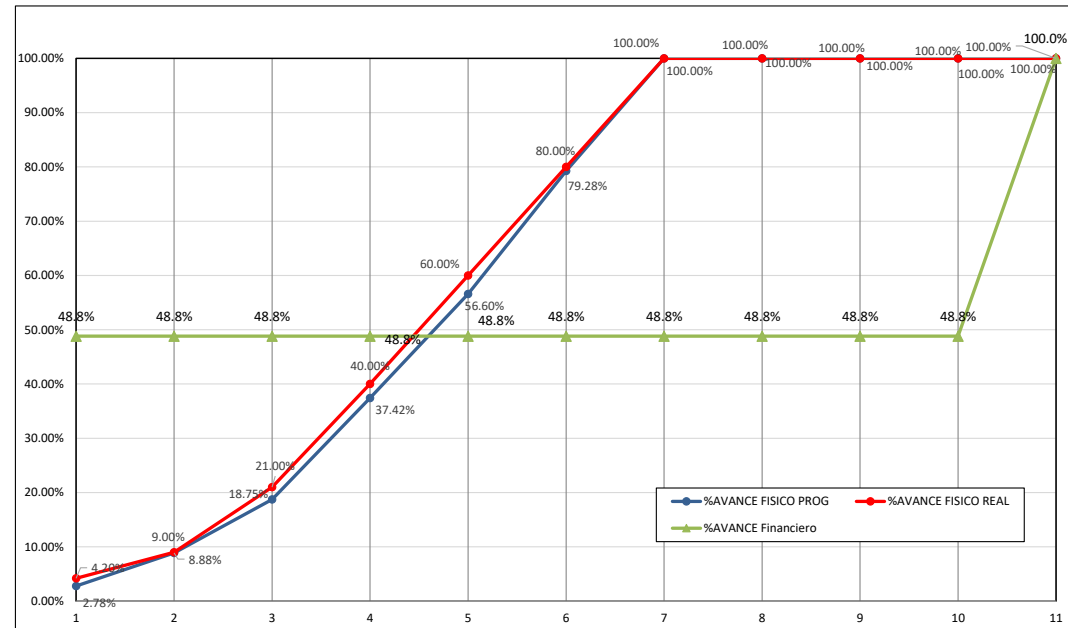

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
