

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FIS MDF 11-023 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN III CALLE: ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE JOSÉ ARTEAGA Y CALLE FAROL, FIS MDF 11-026 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN IV ACCESO A RANCHO NUEVO Y TURQUESA PONIENTE

**Ubicación:** MACARIO J. GÓMEZ y RANCHO NUEVO

**Contrato:** FIS MDF 023-026/2021

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

**Contratista:** ECOSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**Programa:** SG ELECTRIFICACIÓN

**Inicio Vigente:** miércoles, 16 de junio de 2021

**Días de Obra:** 45 días

**Subprograma:** 02 b) RURAL - AMPLIACIÓN

**Inicio Real:** miércoles, 16 de junio de 2021

**Monto Contratado:** \$1,111,674.46


**Residente:** ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

**Fin Vigente:** viernes, 30 de julio de 2021

**Monto Ejercido:** \$1,111,674.46

**Fin Real:** viernes, 30 de julio de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2021	10.05%	12.00%	50.0%
2	28/06/2021	20.12%	25.00%	50.0%
3	05/07/2021	31.80%	35.00%	50.0%
4	12/07/2021	56.33%	60.00%	50.0%
5	19/07/2021	72.50%	75.00%	50.0%
6	26/07/2021	88.00%	90.00%	50.0%
7	02/08/2021	100.00%	100.00%	50.0%
8	09/08/2021	100.00%	100.00%	50.0%
9	16/08/2021	100.00%	100.00%	50.0%
10	23/08/2021	100.00%	100.00%	50.0%
11	30/08/2021	100.00%	100.00%	100.00%

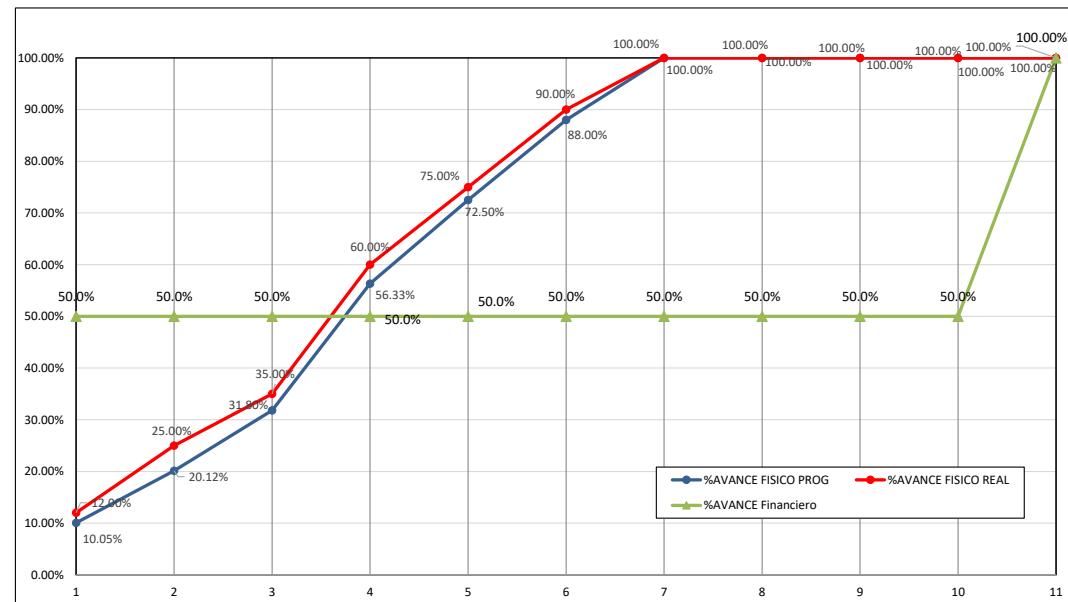

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
