

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PFR 003/2021 REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE PASEOS DE LA PROVIDENCIA

**Ubicación:** FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA

**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2020

**Programa:** SE URBANIZACIÓN

**Subprograma:** 07 a) PARQUES PÚBLICOS Y RECREATIVOS - REHABILITACIÓN

**Residente:** ARQ. PEDRO ANONIO MEDINA FUENTES

**Contrato:** PFR 003/2021

**Contratista:** SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALES ROOT, S.A. DE C.V.

**Inicio Vigente:** viernes, 28 de mayo de 2021

**Inicio Real:** viernes, 28 de mayo de 2021

**Fin Vigente:** domingo, 11 de julio de 2021


**Fin Real:** domingo, 11 de julio de 2021

**Días de Obra:** 45 días

**Monto Contratado:** \$ 1,446,930.00

**Monto Ejercido:** \$ 1,446,930.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/05/2021	1.50%	3.00%	49.1%
2	07/06/2021	22.80%	25.00%	49.1%
3	14/06/2021	35.05%	38.00%	49.1%
4	21/06/2021	44.23%	45.00%	49.1%
6	28/06/2021	62.51%	65.00%	76.2%
6	05/07/2021	89.33%	90.00%	76.2%
7	12/07/2021	100.00%	100.00%	76.2%
8	19/07/2021	100.00%	100.00%	76.2%
9	26/07/2021	100.00%	100.00%	98.2%
10	02/08/2021	100.00%	100.00%	98.2%
11	09/08/2021	100.00%	100.00%	100.0%

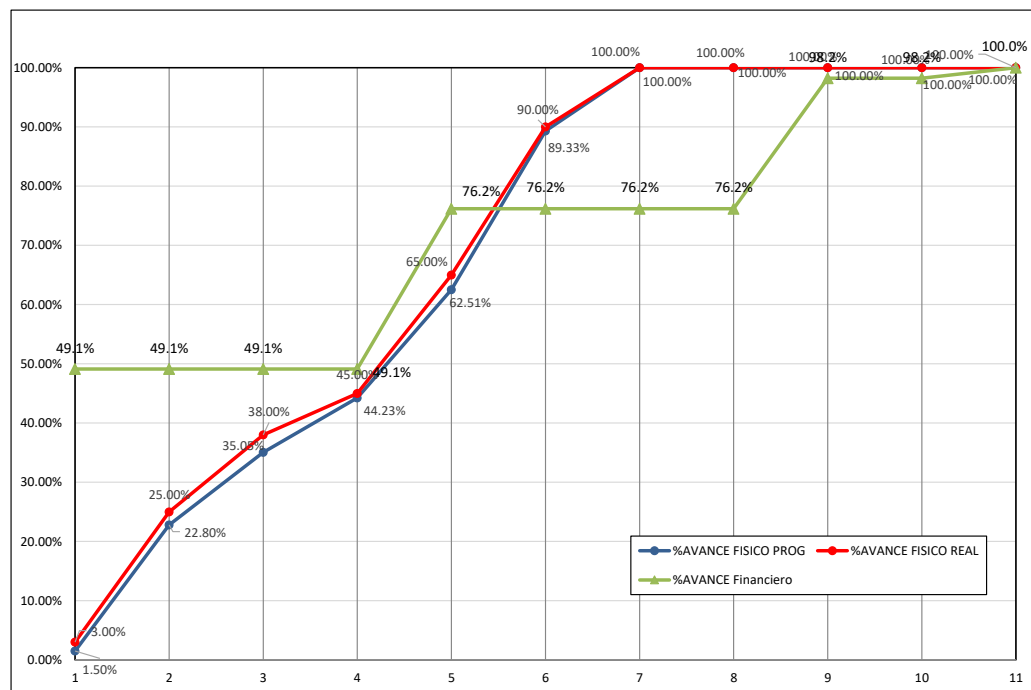

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
