


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PFR 004/2021 REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE RECREATIVO LORETITO  
**Ubicación:** LORETITO **Contrato:** PFR 004/2021  
**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2020 **Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
**Programa:** SE URBANIZACIÓN **Inicio Vigente:** lunes, 24 de mayo de 2021 **Días de Obra:** 45 días  
**Subprograma:** 07 a) PARQUES PÚBLICOS Y RECREATIVOS – REHABILITACIÓN **Inicio Real:** lunes, 24 de mayo de 2021 **Monto Contratado:** \$ 1,479,110.00  
**Residente:** ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES **Fin Vigente:** miércoles, 7 de julio de 2021 **Monto Ejercido:** \$ 1,479,110.00  
**Fin Real:** miércoles, 7 de julio de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FÍSICO PROG	%AVANCE FÍSICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/05/2021	9.09%	10.00%	49.1%
2	07/06/2021	25.87%	28.00%	49.1%
3	14/06/2021	41.41%	45.00%	57.6%
4	21/06/2021	55.76%	58.00%	57.6%
5	28/06/2021	68.37%	70.00%	76.2%
6	05/07/2021	92.16%	96.00%	76.2%
7	12/07/2021	100.00%	100.00%	76.2%
8	19/07/2021	100.00%	100.00%	76.2%
9	26/07/2021	100.00%	100.00%	76.2%
10	02/08/2021	100.00%	100.00%	76.2%
11	09/08/2021	100.00%	100.00%	100.0%

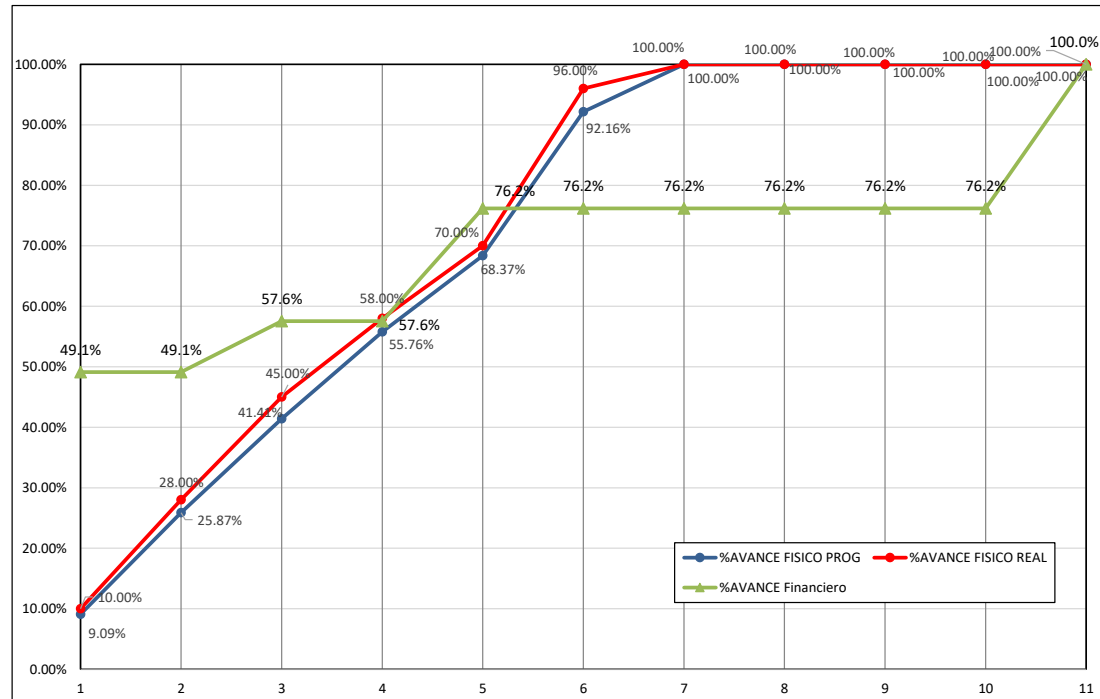

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
