

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-018 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CALLE EZIQUIO RAMIREZ A LAZARO CARDENAS
 FISMDF 11-019 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CALLE EZIQUIO RAMIREZ A LAZARO CARDENAS

Ubicación: LORETITO

Contrato: FISMDF 018-019/2021

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: lunes, 7 de junio de 2021

Días de Obra: 45 días

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: lunes, 7 de junio de 2021

Monto Contratado: \$642,147.00


Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Fin Vigente: miércoles, 21 de julio de 2021

Monto Ejercido: \$642,147.00

Fin Real: miércoles, 21 de julio de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/06/2021	7.50%	8.00%	49.0%
2	21/06/2021	38.14%	40.00%	50.0%
3	28/06/2021	54.02%	55.00%	50.0%
4	05/07/2021	68.86%	69.00%	50.0%
5	12/07/2021	79.42%	80.00%	50.0%
6	19/07/2021	88.16%	89.00%	66.7%
7	26/07/2021	100.00%	100.00%	66.7%
8	02/08/2021	100.00%	100.00%	77.2%
9	09/08/2021	100.00%	100.00%	77.2%
10	16/08/2021	100.00%	100.00%	77.2%
11	23/08/2021	100.00%	100.00%	100.0%

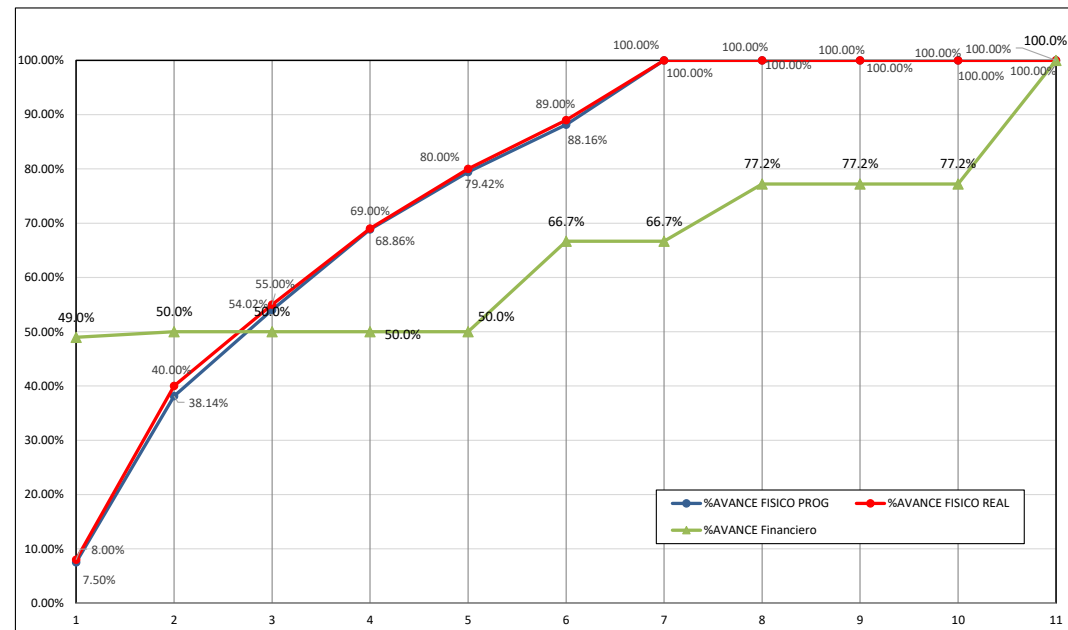

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
