

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FISMDF 11-024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FELIPE RODRIGUEZ, TRAMO AV. REBECA RODRIGUEZ RECIO A LA ESCUELA  
 FISMDF 11-025 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FELIPE RODRIGUEZ, TRAMO AV. REBECA RODRIGUEZ RECIO A LA ESCUELA

**Ubicación:** VIÑEDOS RIBIER

**Contrato:** FISMDF 024-025/2021

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

**Contratista:** BENJAMIN MACIAS GASPAR

**Programa:** SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** lunes, 7 de junio de 2021

**Días de Obra:** 45 días

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN

**Inicio Real:** lunes, 7 de junio de 2021

**Monto Contratado:** \$471,886.00


**Residente:** T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**Fin Vigente:** miércoles, 21 de julio de 2021

**Monto Ejercido:** \$471,886.00

**Fin Real:** miércoles, 21 de julio de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/06/2021	1.47%	2.50%	49.0%
2	21/06/2021	10.28%	12.80%	49.0%
3	28/06/2021	29.21%	32.50%	86.5%
4	05/07/2021	57.45%	60.00%	86.5%
5	12/07/2021	79.76%	80.00%	86.5%
6	19/07/2021	97.03%	98.00%	86.5%
7	26/07/2021	100.00%	100.00%	86.5%
8	02/08/2021	100.00%	100.00%	86.5%
9	09/08/2021	100.00%	100.00%	86.5%
10	16/08/2021	100.00%	100.00%	86.5%
11	23/08/2021	100.00%	100.00%	100.00%

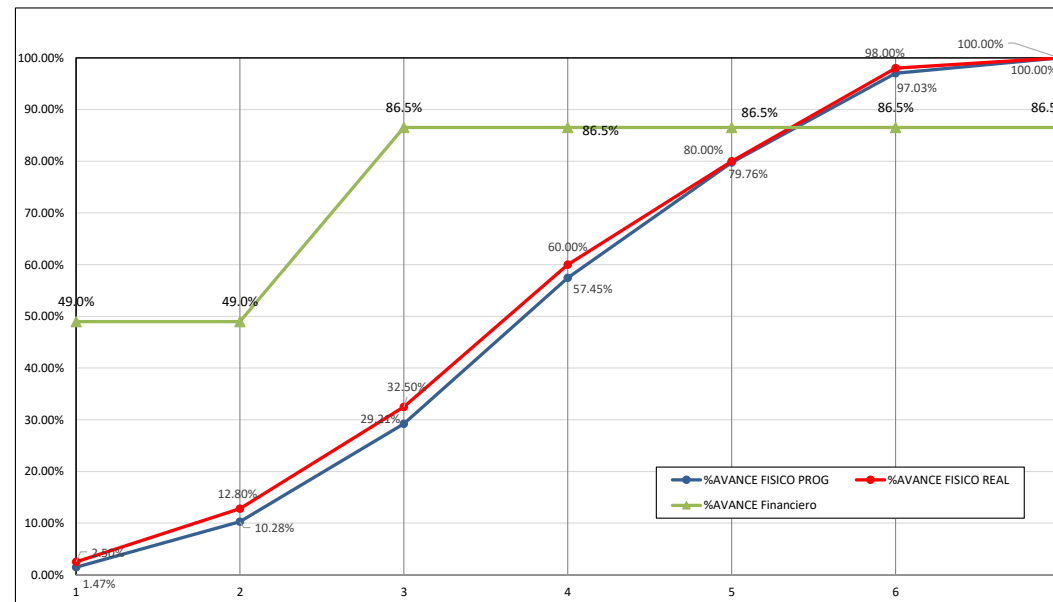

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
