

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 001/21 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Ubicación: TODO EL MUNICIPIO

Contrato: IP 001/21

Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS 2021

Contratista: Ing. Ángel de Jesús Ramírez Guardado

Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

Inicio Vigente: sábado, 13 de febrero de 2021

Días de Obra: 300

Subprograma: 01, 03 ESTUDIOS Y PROYECTOS, SERVICIOS

Inicio Real: sábado, 13 de febrero de 2021

Monto Contratado: \$ 199,990.00


Residente:

Fin Vigente: jueves, 9 de diciembre de 2021

Monto Ejercido:

Fin Real:

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 16/02/2021 | 33.41% | 35.00% | 0.0% |
| 2 | 01/03/2021 | 34.78% | 37.00% | 0.0% |
| 3 | 15/03/2021 | 36.15% | 38.00% | 0.0% |
| 4 | 29/03/2021 | 42.00% | 40.00% | 0.0% |
| 5 | 12/04/2021 | 43.37% | 44.00% | 0.0% |
| 6 | 26/04/2021 | 44.74% | 45.00% | 0.0% |
| 7 | 10/05/2021 | 46.11% | 47.00% | 0.0% |
| 8 | 24/05/2021 | 50.00% | 50.50% | 0.0% |
| 9 | 07/06/2021 | 51.37% | 52.00% | 0.0% |
| 10 | 21/06/2021 | 52.74% | 54.00% | 0.0% |
| 11 | 05/07/2021 | 54.11% | 55.00% | 0.0% |
| 12 | 19/07/2021 | 55.48% | 56.00% | 0.0% |
| 13 | 02/08/2021 | 56.85% | 57.00% | 0.0% |
| 14 | 16/08/2021 | 58.22% | 59.00% | 0.0% |
| 15 | 30/08/2021 | 59.59% | 60.00% | 0.0% |
| 16 | 13/09/2021 | 60.96% | 62.00% | 0.0% |
| 17 | 27/09/2021 | 62.33% | 63.70% | 0.0% |
| 18 | 11/10/2021 | 63.70% | 65.07% | 0.0% |
| 19 | 25/10/2021 | 65.07% | | |
| 20 | 08/11/2021 | 66.44% | | |
| 21 | 22/11/2021 | 72.00% | | |
| 22 | 06/12/2021 | 89.00% | | |
| 23 | 20/12/2021 | 100.00% | | |

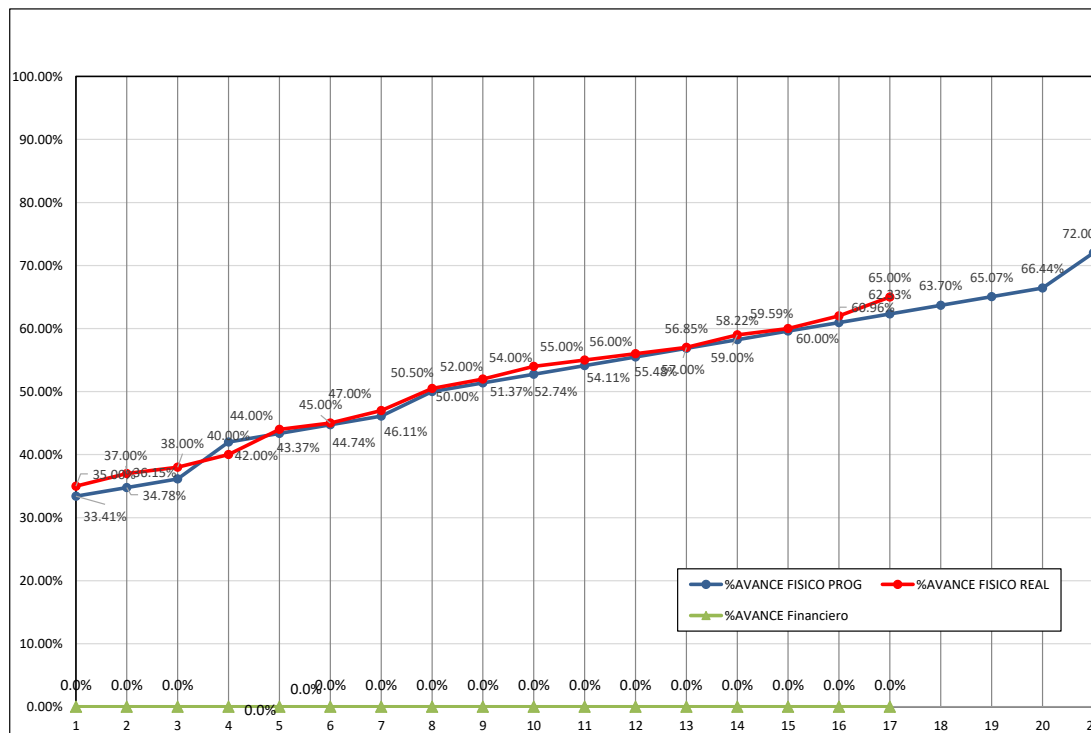

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
