


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 002/21 PERITO RESPONSABLE DE: 22 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA)
Ubicación: TODO EL MUNICIPIO **Contrato:** IP 002/21
Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS 2021 **Contratista:** PROYECTOS SIGMMA, S.A. DE C.V.
Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL **Inicio Vigente:** jueves, 20 de mayo de 2021 **Días de Obra:** 220
Subprograma: 01, 03 ESTUDIOS Y PROYECTOS, SERVICIOS **Inicio Real:** jueves, 20 de mayo de 2021 **Monto Contratado:** \$ 152,052.80
Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** sábado, 25 de diciembre de 2021 **Monto Ejercido:**
Fin Real:

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 24/05/2021 | 2.73% | 3.00% | 0.0% |
| 2 | 07/06/2021 | 6.84% | 7.00% | 0.0% |
| 3 | 21/06/2021 | 8.80% | 9.00% | 0.0% |
| 4 | 05/07/2021 | 12.55% | 13.00% | 0.0% |
| 5 | 19/07/2021 | 16.36% | 18.00% | 0.0% |
| 6 | 02/08/2021 | 23.96% | 25.00% | 0.0% |
| 7 | 16/08/2021 | 28.10% | 30.00% | 0.0% |
| 8 | 30/08/2021 | 30.45% | 33.00% | 0.0% |
| 9 | 13/09/2021 | 32.36% | 35.00% | 0.0% |
| 10 | 27/09/2021 | 38.01% | 40.00% | 0.0% |
| 11 | 11/10/2021 | 42.69% | | |
| 12 | 25/10/2021 | 48.16% | | |
| 13 | 08/11/2021 | 53.82% | | |
| 14 | 22/11/2021 | 64.95% | | |
| 15 | 06/12/2021 | 79.50% | | |
| 16 | 20/12/2021 | 94.05% | | |
| 17 | 03/01/2022 | 100.00% | | |

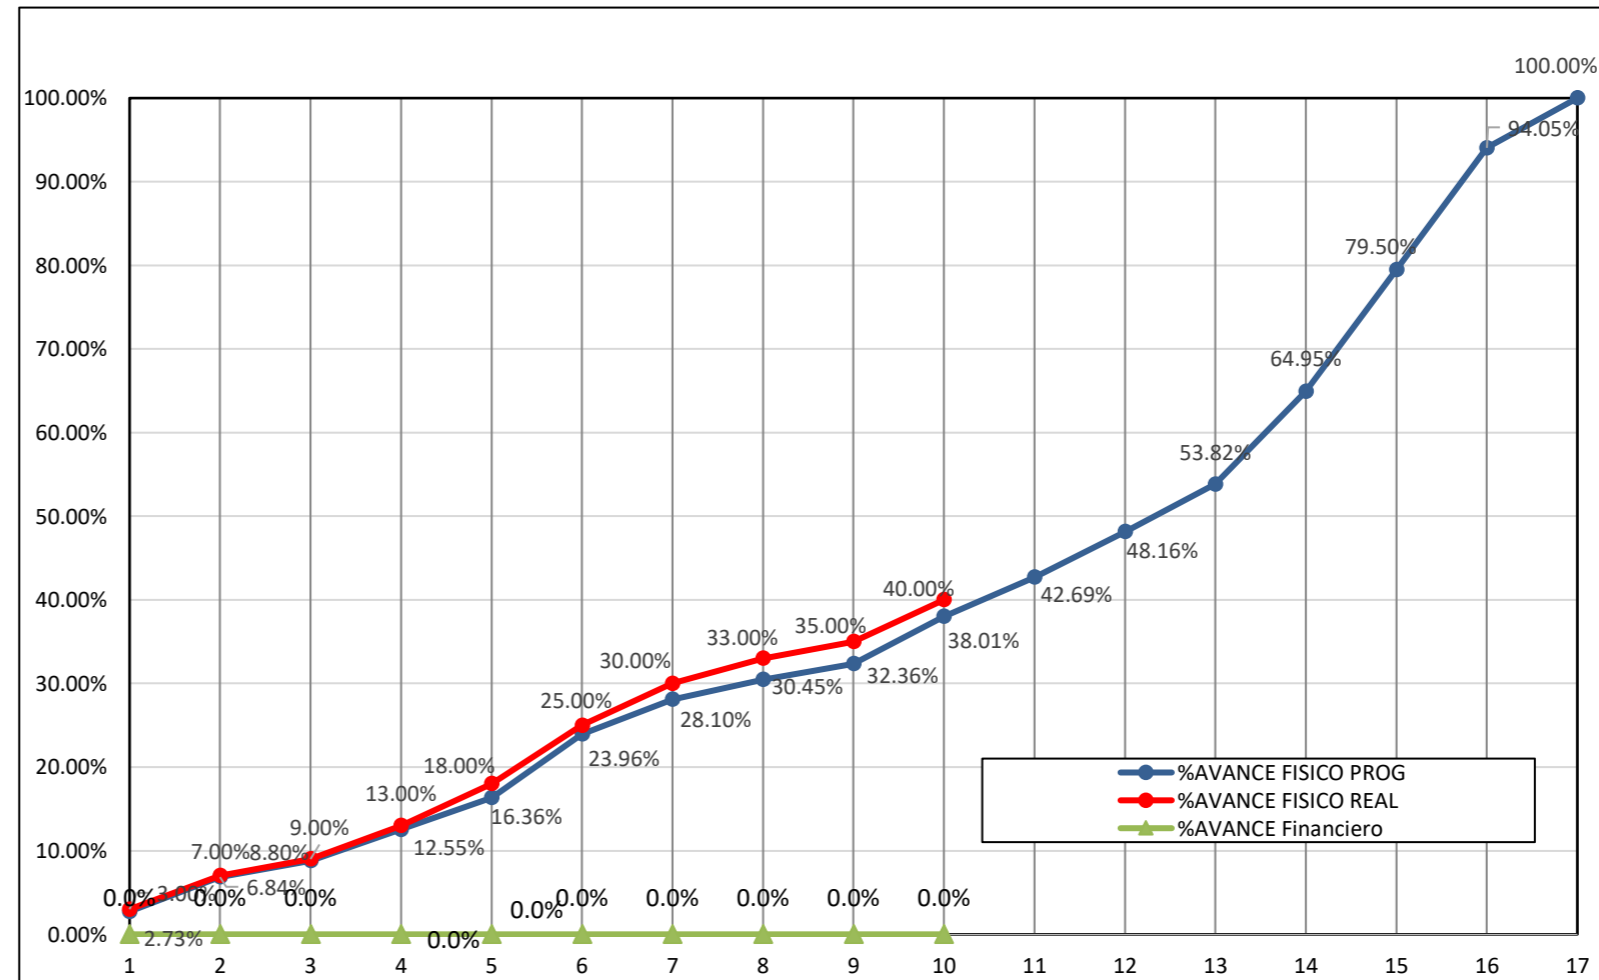

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
