


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PFR 001/21 REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, UNIDAD DEPORTIVA FRACC. MIGUEL HIDALGO				
Ubicación:	FRACC. HIDALGO.- CABECERA MUNICIPAL	Contrato:	PFR 001/2021		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2020	Contratista:	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ, I.C.		
Programa:	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Inicio Vigente:	viernes, 30 de abril de 2021	Días de Obra:	21 días
Subprograma:	02 b) CONSTRUCCIÓN - PRIMARIA	Inicio Real:	viernes, 30 de abril de 2021	Monto Contratado:	\$ 462,740.00
Residente:	ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES	Fin Vigente:	jueves, 20 de mayo de 2021	Monto Ejercido:	\$ 462,740.00
		Fin Real:	jueves, 20 de mayo de 2021		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	03/05/2021	1.05%	2.50%	49.3%
2	10/05/2021	21.59%	25.00%	49.3%
3	17/05/2021	86.64%	89.00%	49.3%
4	24/05/2021	100.00%	100.00%	49.3%
5	31/05/2021	100.00%	100.00%	49.3%
6	07/06/2021	100.00%	100.00%	49.3%
7	14/06/2021	100.00%	100.00%	100.0%

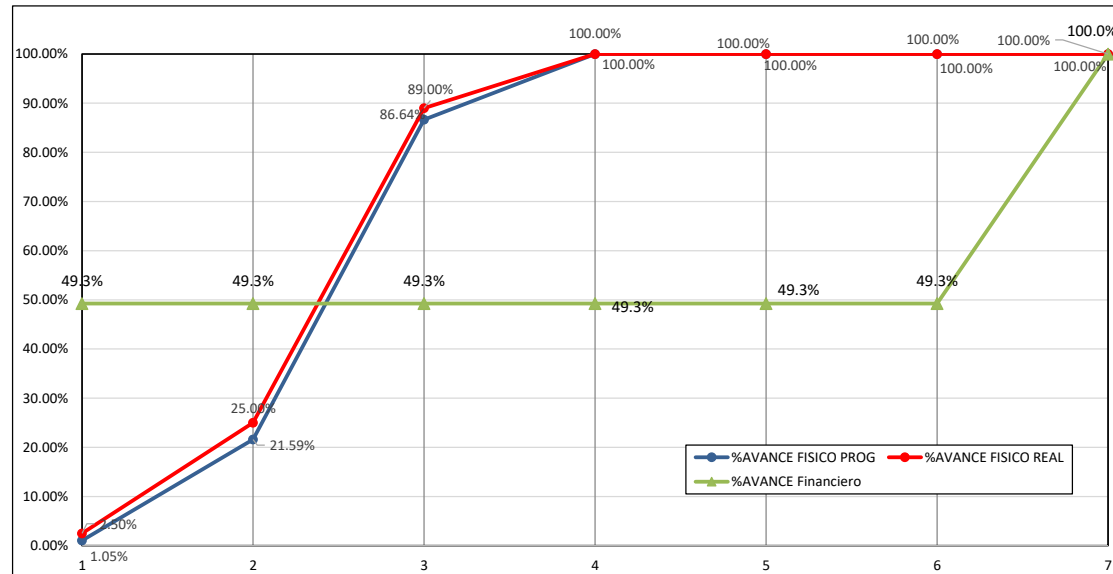

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
