


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PFR 002/2021 REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE EL CARDONAL		
Ubicación:	FRACC. EL CARDONAL	Contrato:	PFR 002/2021
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2020	Contratista:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
Programa:	SE URBANIZACIÓN	Inicio Vigente:	viernes, 21 de mayo de 2021
Subprograma:	07 a) PARQUES PÚBLICOS Y RECREATIVOS – REHABILITACIÓN	Días de Obra:	45 días
Residente:	ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES	Inicio Real:	viernes, 21 de mayo de 2021
		Fin Vigente:	domingo, 4 de julio de 2021
		Fin Real:	domingo, 4 de julio de 2021
		Monto Contratado:	\$ 611,220.00
		Monto Ejercido:	\$ 611,220.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FÍSICO PROG	%AVANCE FÍSICO REAL	%AVANCE Financiero
1	24/05/2021	18.00%	20.00%	48.8%
2	31/05/2021	38.00%	40.00%	48.8%
3	07/06/2021	58.00%	60.00%	48.8%
4	14/06/2021	84.00%	85.00%	48.8%
5	21/06/2021	87.00%	89.00%	48.8%
6	28/06/2021	94.00%	96.00%	48.8%
7	05/07/2021	100.00%	100.00%	48.8%
8	12/07/2021	100.00%	100.00%	96.8%
9	19/07/2021	100.00%	100.00%	96.8%
10	26/07/2021	100.00%	100.00%	100.0%

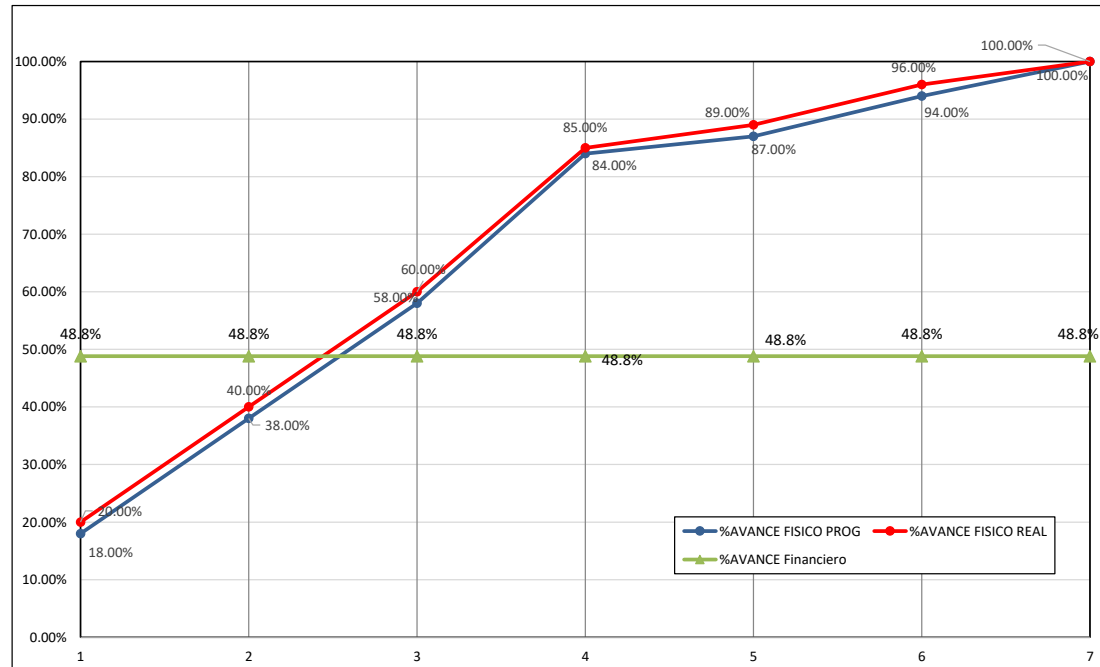

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
