

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:

FISMDF 11-003 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ Y CALLE MATAMOROS
 FISMDF 11-004 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ Y CALLE MATAMOROS
 FISMDF 11-020 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE LAZARO CARMENAS, TRAMO CALLE GUADALUPE MELENDEZ A CALLE GUADALUPE VICTORIA
 FISMDF 11-021 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE LAZARO CARMENAS, TRAMO CALLE GUADALUPE MELENDEZ A CALLE GUADALUPE VICTORIA
 COL CENTRO CABECERA MUNICIPAL Y LORETTIO.

Ubicación:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
 DEL DISTRITO FEDERAL 2021

Tipo de Inversión:

SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE
 01 REHABILITACION

Programa:


ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Residente:

Inicio Vigente: Lunes, 19 de julio de 2021
 Inicio Real: Lunes, 19 de julio de 2021
 Fin Vigente: miércoles, 1 de septiembre de 2021
 Fin Real: miércoles, 1 de septiembre de 2021

Construista: LMA4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
 Dias de Obra: 45 dias
 Monto Contratado: \$1,509,704.00
 Monto Ejecutado: \$1,509,704.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	26/07/2021	0.99%	2.00%	50.0%
2	02/08/2021	7.44%	8.50%	50.0%
3	09/08/2021	23.11%	27.00%	50.0%
4	16/08/2021	41.15%	45.00%	50.0%
5	23/08/2021	48.32%	70.00%	56.0%
6	30/08/2021	48.82%	90.00%	58.0%
7	06/09/2021	100.00%	100.00%	58.0%
8	13/09/2021	100.00%	100.00%	58.0%
9	20/09/2021	100.00%	100.00%	48.0%
10	27/09/2021	100.00%	100.00%	75.0%
11	04/10/2021	100.00%	100.00%	100.0%

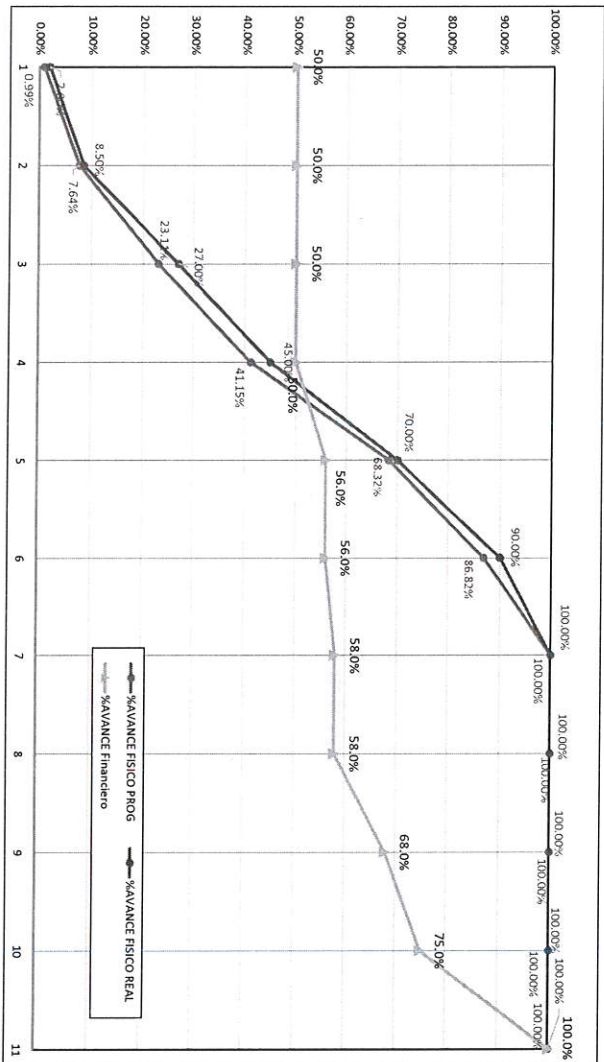

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
