

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-005 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ROMO DE VIVAR, TRAMO CALLE MATAMOROS A CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ
 FISMDF 11-006 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, CALLE ROMO DE VIVAR, TRAMO CALLE MATAMOROS A CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ

Ubicación: FRACC. LOS LIRIOS

Tipo de inversión:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

Programa: SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

Subprograma: 01 REHABILITACION

Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: FISMDF 005-006/2021

Contratista: CORRACO, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: Lunes, 21 de junio de 2021

Fin Vigente: miércoles, 4 de agosto de 2021


Fin Real: miércoles, 4 de agosto de 2021

Días de Obra: 45 días

Monto Contratado: \$1,060,802.00

Monto Ejecido: \$1,060,802.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/06/2021	15.21%	18.00%	50.0%
2	05/07/2021	44.87%	50.00%	50.0%
3	12/07/2021	62.33%	64.00%	50.0%
4	19/07/2021	75.60%	78.00%	50.0%
5	26/07/2021	82.50%	88.00%	50.0%
6	02/08/2021	91.40%	95.00%	50.0%
7	09/08/2021	100.00%	100.00%	72.0%
8	16/08/2021	100.00%	100.00%	85.0%
9	23/08/2021	100.00%	100.00%	98.0%
10	30/08/2021	100.00%	100.00%	98.0%
11	06/09/2021	100.00%	100.00%	100.0%

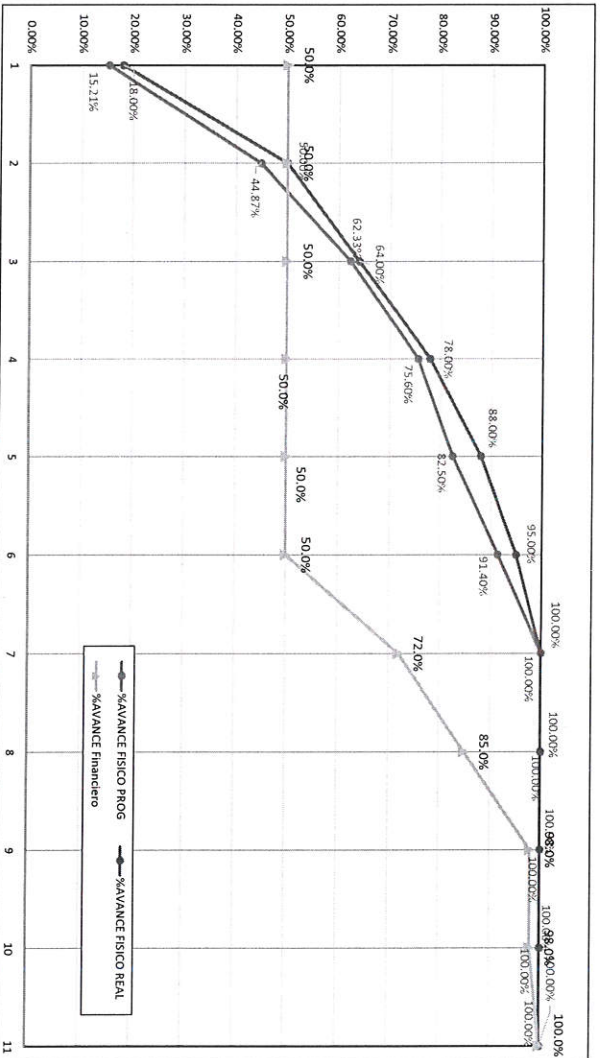

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
