


### GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-007 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES TRAMO AV. JUÁREZ A CALLE ROMO DE VIVAR

Ubicación: FRACC. LOS LIRIOS  
 Tipo de Inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021  
 Programa: SD ALCANTARILLADO  
 Subprograma: 01 REHABILITACIÓN  
 Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contrato: FISMDF 007/2021  
 Contratista: URDZ SUPERVISIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.  
 Inicio Vigente: Lunes, 14 de junio de 2021  
 Inicio Real: Lunes, 14 de junio de 2021  
 Fin Vigente: miércoles, 28 de julio de 2021  
 Fin Real: miércoles, 28 de julio de 2021  
 Días de Obra: 45 días  
 Monto Contratado: \$1080,298.00  
 Monto Ejercido: \$1080,298.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE FINANCIERO
1	19/06/2021	10.05%	11.00%	50.0%
2	26/06/2021	20%	22.00%	50.0%
3	03/07/2021	38.91%	40.20%	50.0%
4	10/07/2021	58.50%	62.00%	71.7%
5	17/07/2021	78.07%	80.00%	71.7%
6	24/07/2021	96.74%	98.00%	71.7%
7	31/07/2021	100.00%	100.00%	91.3%
8	07/08/2021	100.00%	100.00%	91.3%
9	14/08/2021	100.00%	100.00%	91.3%
10	21/08/2021	100.00%	100.00%	91.3%
11	28/08/2021	100.00%	100.00%	100.0%

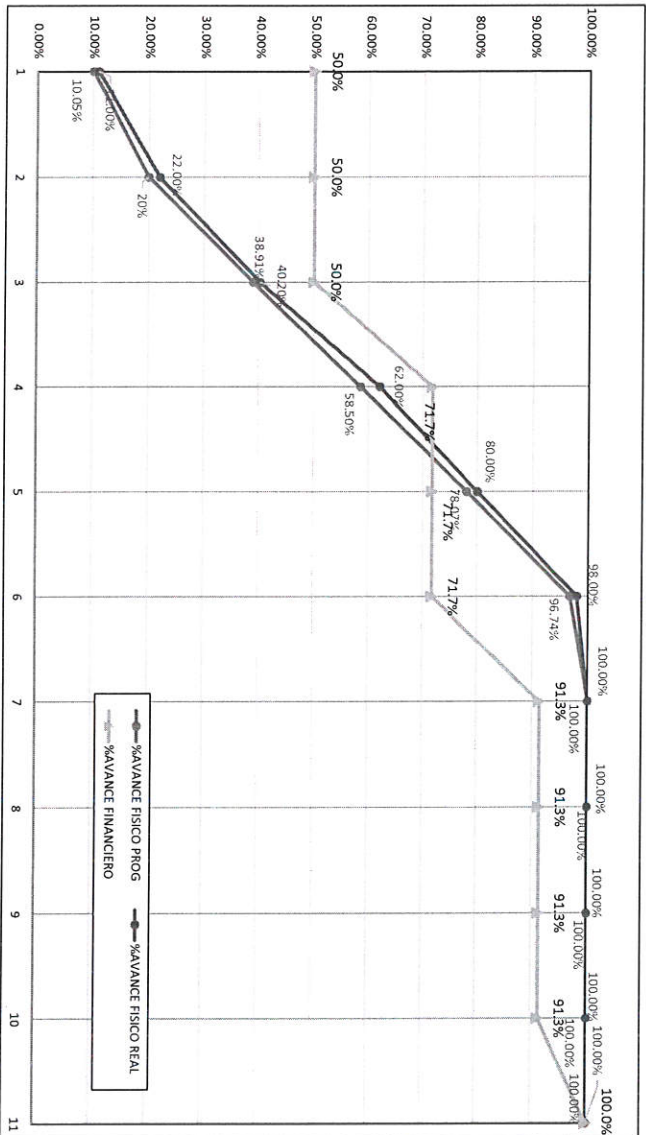

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
