

### GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:

FISMDF 11-008 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES TRAMO AV. JUÁREZ A CALLE ROMO DE VIVAR  
 FISMDF 11-013 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PRIVADA LAZARO CARDENAS  
 FISMDF 11-014 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, PRIVADA LAZARO CARDENAS  
 FISMDF 11-015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA LAZARO CARDENAS, LORETTITO, S.F.R.  
 FISMDF 11-016 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EZQUIO RAMIREZ TRAMO CALLE GUADALUPE MELENDEZ A CALLE GUADALUPE VICTORIA  
 FISMDF 11-017 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE EZQUIO RAMIREZ TRAMO CALLE GUADALUPE MELENDEZ A CALLE GUADALUPE VICTORIA  
 LORETTITO Y FRACC LIRIOS

Tipo de Inversión:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

Contratista: MAOFFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE CV.

Programa:

SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: jueves, 8 de julio de 2021

Días de Obra: 45 días

Subprograma:

01 REHABILITACION

Inicio Real: jueves, 8 de julio de 2021

Monto Contratado: \$1,520,721.00

Residente:


ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Fin Vigente: sábado, 21 de agosto de 2021

Monto Ejecutado: \$1,520,721.00

Fin Real: sábado, 21 de agosto de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/07/2021	1.80%	2.80%	50.0%
2	19/07/2021	7.64%	9.00%	50.0%
3	26/07/2021	23.11%	25.00%	50.0%
4	02/08/2021	41.15%	44.00%	50.0%
5	09/08/2021	68.32%	70.00%	50.0%
6	16/08/2021	86.82%	88.00%	51.7%
7	23/08/2021	100.00%	100.00%	62.2%
8	30/08/2021	100.00%	100.00%	62.2%
9	06/09/2021	100.00%	100.00%	76.9%
10	13/09/2021	100.00%	100.00%	76.9%
11	20/09/2021	100.00%	100.00%	100.0%

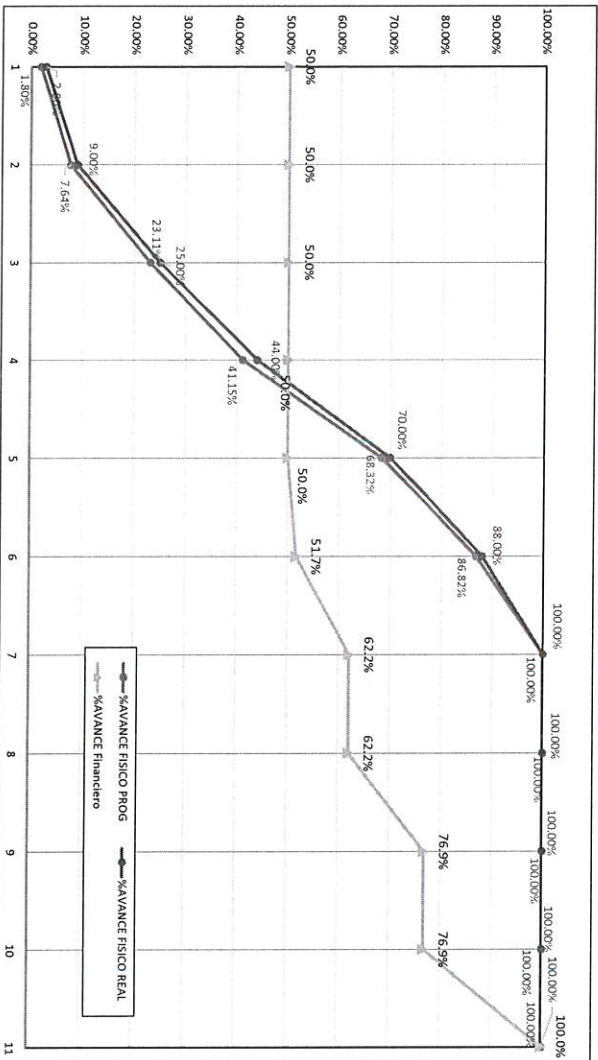

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
