

### GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF-11-009 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RIO SAN PEDRO  
 FISMDF-11-010 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, TRAMO CALLE ROMO DE VIVAR A CALLE RIO SAN PEDRO

Ubicación: FRACC. LOS LIRIOS

Tipo de Inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

Programa: SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

Subprograma: 01 REHABILITACION

Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: FISMDF-009-010/2021

Proyectos y Construcciones de la Peña en Aguascalientes, S.A. de C.V.

Inicio Vigente: Lunes, 21 de junio de 2021

Inicio Real: Lunes, 21 de junio de 2021

Fin Vigente: miércoles, 4 de agosto de 2021


Fin Real: miércoles, 4 de agosto de 2021

Días de Obra: 45 días

Monto Contratado: \$1,078,953.00

Monto Ejecido: \$1,078,953.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/06/2021	21.91%	24.00%	50.0%
2	05/07/2021	43.83%	45.00%	50.0%
3	12/07/2021	58.01%	60.00%	50.0%
4	19/07/2021	72.20%	74.00%	70.6%
5	26/07/2021	86.10%	87.00%	70.6%
6	02/08/2021	97.22%	98.00%	70.6%
7	09/08/2021	100.00%	100.00%	70.6%
8	16/08/2021	100.00%	100.00%	97.8%
9	23/08/2021	100.00%	100.00%	97.8%
10	30/08/2021	100.00%	100.00%	97.8%
11	06/09/2021	100.00%	100.00%	100.0%

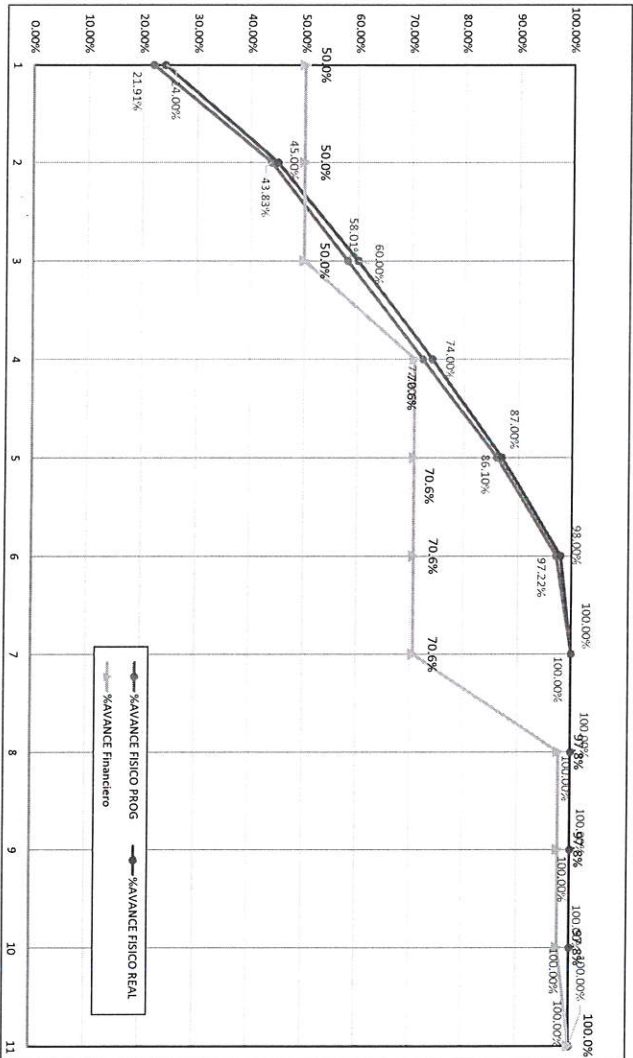

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

*[Handwritten signature]*
