

### GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF-11-011 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN I CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ NUÑEZ  
 FISMDF-11-012 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN II CALLE PROL. LAZARO CARDENAS

Ubicación: LORETTITO

Tipo de Inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021  
 SG ELECTRIFICACIÓN

Programa: 02 b) RURAL - AMPLIACIÓN

Subprograma: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES  
 Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: FISMDF-011-012/2021

Contratista: ELECTRICA AMCO, S. DE R.L. DE C.V.

Inicio Vigente: jueves, 24 de junio de 2021

Inicio Real: jueves, 24 de junio de 2021

Fin Vigente: sábado, 7 de agosto de 2021


Fin Real: sábado, 7 de agosto de 2021

Días de Obra: 45 días

Monto Contratado: \$1,472,260.49

Monto Ejecido: \$1,472,260.49

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/04/2021	8.00%	10.00%	50.0%
2	05/07/2021	28.50%	30.00%	50.0%
3	12/07/2021	59.50%	62.00%	50.0%
4	19/07/2021	67.0%	71.00%	56.6%
5	26/07/2021	72.00%	75.00%	56.6%
6	02/08/2021	92.00%	99.00%	56.6%
7	09/08/2021	100.00%	100.00%	79.2%
8	16/08/2021	100.00%	100.00%	79.2%
9	23/08/2021	100.00%	100.00%	79.2%
10	30/08/2021	100.00%	100.00%	79.2%
11	06/09/2021	100.00%	100.00%	100.0%

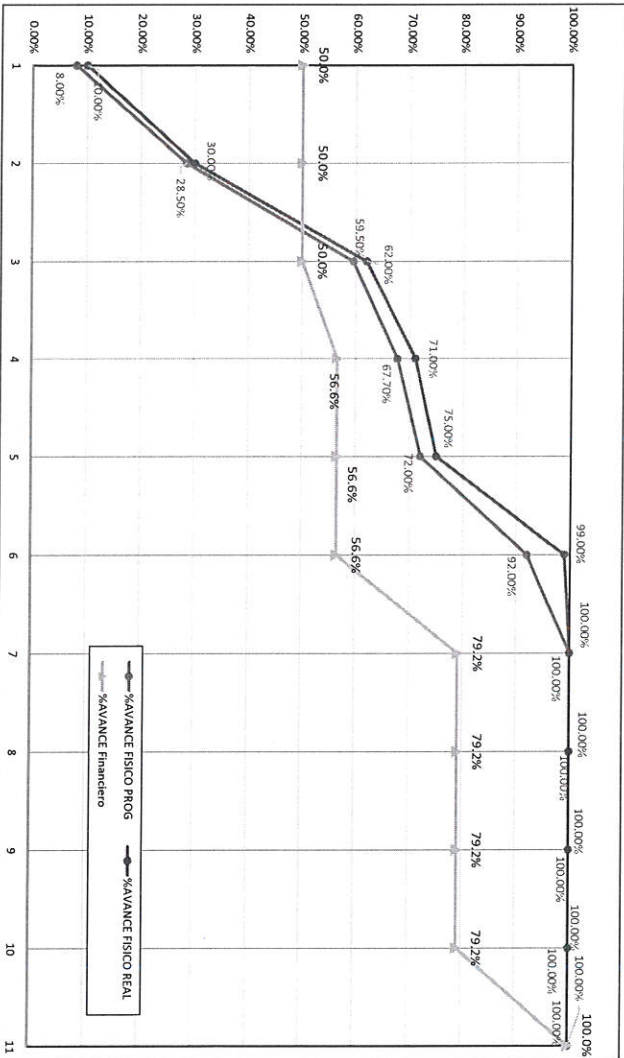

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
