

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: FISIMDF-11-022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LAZARO CARDENAS

Ubicación: LORETTTO
 Tipo de Inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021
 Programa: SF. SE PAVIMENTO EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACION
 Subprograma: 01. 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS
 Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCIA

Contrato: FISIMDF 022/2021
 Contratista: LEOPOLDO MORONES FONSECA, TEC. MANT. IND
 Inicio Vigente: Lunes, 16 de agosto de 2021
 Inicio Real: Lunes, 16 de agosto de 2021
 Fin Vigente: miércoles, 29 de septiembre de 2021
 Fin Real: miércoles, 29 de septiembre de 2021

Días de Obra: 45 días
 Monto Contratado: \$1,403,827.00
 Monto Ejercido: \$1,403,827.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	23/08/2021	2.78%	4.20%	50.0%
2	30/08/2021	8.88%	9.00%	50.0%
3	06/09/2021	18.75%	21.00%	50.0%
4	13/09/2021	37.42%	40.00%	50.0%
5	20/09/2021	56.40%	60.00%	59.0%
6	27/09/2021	79.28%	80.00%	59.0%
7	04/10/2021	100.00%	100.00%	72.2%
8	11/10/2021	100.00%	100.00%	72.2%
9	18/10/2021	100.00%	100.00%	86.4%
10	25/10/2021	100.00%	100.00%	86.4%
11	01/11/2021	100.00%	100.00%	100.0%

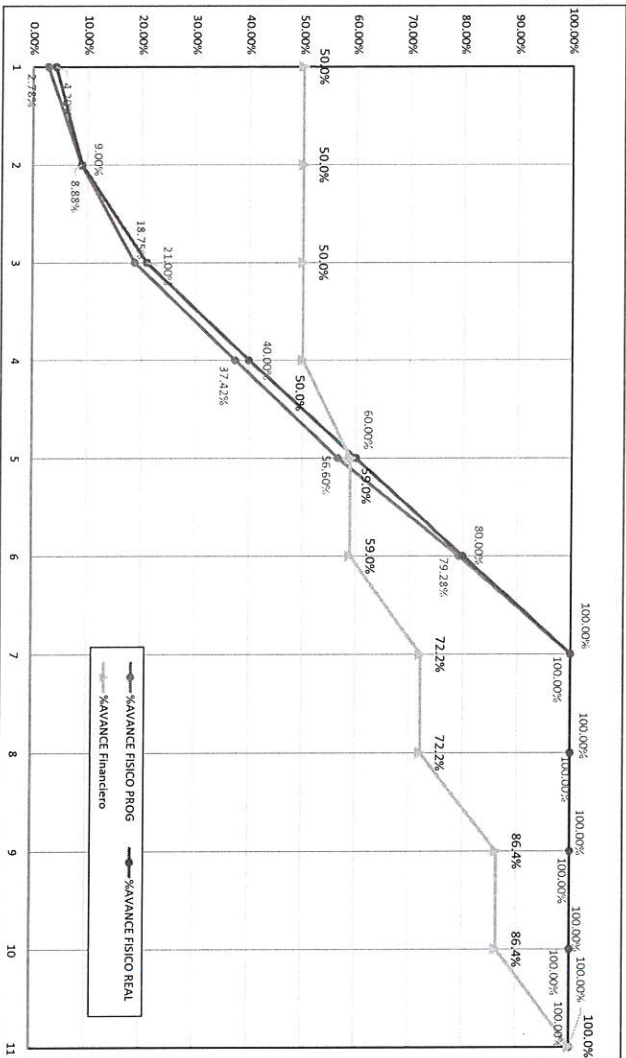

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
