


### GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISIMDF 11-023 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN III CALLE: ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE JOSÉ ARTEAGA Y CALLE FAROL, FISIMDF 11-026 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN IV ACCESO A RANCHO NUEVO Y TURQUESA PONIENTE

Ubicación: MACARIO J. GÓMEZ Y RANCHO NUEVO  
 Tipo de Inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021  
 Programa: SG ELECTRIFICACIÓN  
 Subprograma: 02 b) RURAL - AMPLIACIÓN  
 Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: FISIMDF 023-026/2021  
 Contratista: ECOSTRUCTURACIONES, S.A. DE C.V.  
 Inicio Vigente: miércoles, 16 de junio de 2021  
 Inicio Real: miércoles, 16 de junio de 2021  
 Fin Vigente: viernes, 30 de julio de 2021  
 Fin Real: viernes, 30 de julio de 2021  
 Dias de Obra: 45 días  
 Monto Contratado: \$1,171,674.46  
 Monto Ejecido: \$1,171,674.46

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2021	10.05%	12.00%	50.0%
2	28/06/2021	20.12%	25.00%	50.0%
3	05/07/2021	31.80%	35.00%	50.0%
4	12/07/2021	46.33%	40.00%	50.0%
5	19/07/2021	72.50%	75.00%	50.0%
6	26/07/2021	88.00%	90.00%	50.0%
7	02/08/2021	100.00%	100.00%	50.0%
8	09/08/2021	100.00%	100.00%	50.0%
9	16/08/2021	100.00%	100.00%	50.0%
10	23/08/2021	100.00%	100.00%	93.7%
11	30/08/2021	100.00%	100.00%	100.00%

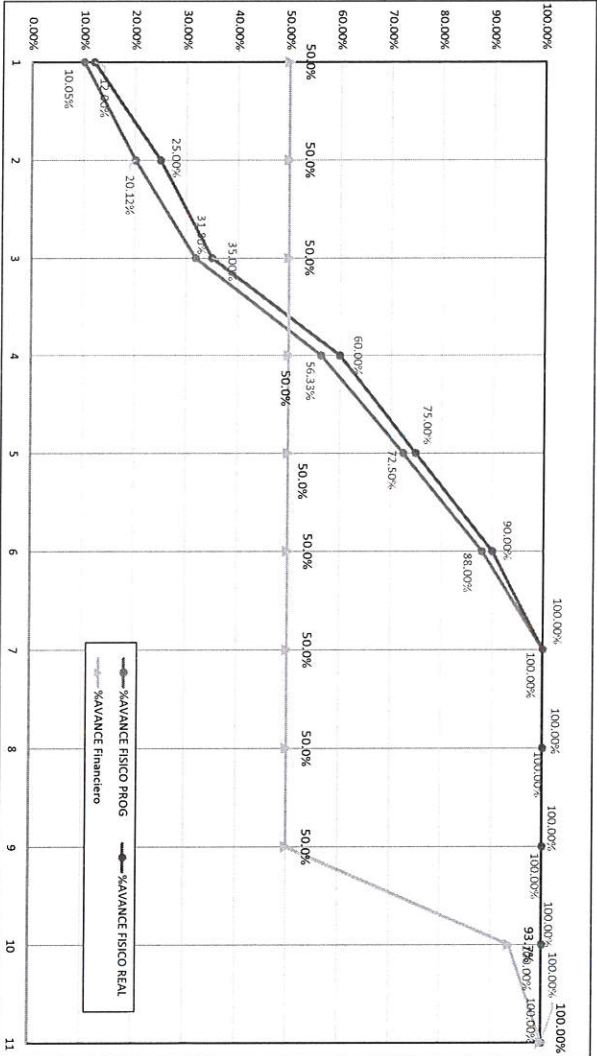

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
