


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISIMDF-11-027 CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CUARTO DORMITORIO Y BAÑO

Ubicación: AMAPOLAS DEL RIO, BORROTES, EL TEREPATE Y RANCHO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL: FFAOC, CERRADA SAN FRANC FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021  
 Programa: S.H. VIVIENDA DIGNA  
 Subprograma: 02 AMPLIACION DE VIVIENDA  
 Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: FISIMDF 027/2021  
 Contratista: OJDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
 Inicio Vigente: miércoles, 3 de noviembre de 2021  
 Inicio Real: miércoles, 3 de noviembre de 2021  
 Fin Vigente: viernes, 17 de diciembre de 2021  
 Fin Real: viernes, 17 de diciembre de 2021  
 Dias de Obra: 45 dias  
 Monto Contratado: \$1,459,348.94  
 Monto Ejecido: \$1,459,348.94

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	03/11/2021	15.20%	16.10%	50.0%
2	10/11/2021	30.40%	33.20%	50.0%
3	17/11/2021	38.20%	38.40%	86.5%
4	24/11/2021	53.44%	56.16%	86.5%
5	01/12/2021	76.48%	78.36%	86.5%
6	08/12/2021	88.24%	89.07%	86.5%
7	15/12/2021	88.24%	89.07%	86.5%
8	22/12/2021	100.00%	100.00%	86.5%
9	29/12/2021	100.00%	100.00%	86.5%
10	05/01/2022	100.00%	100.00%	86.5%
11	12/01/2022	100.00%	100.00%	100.00%

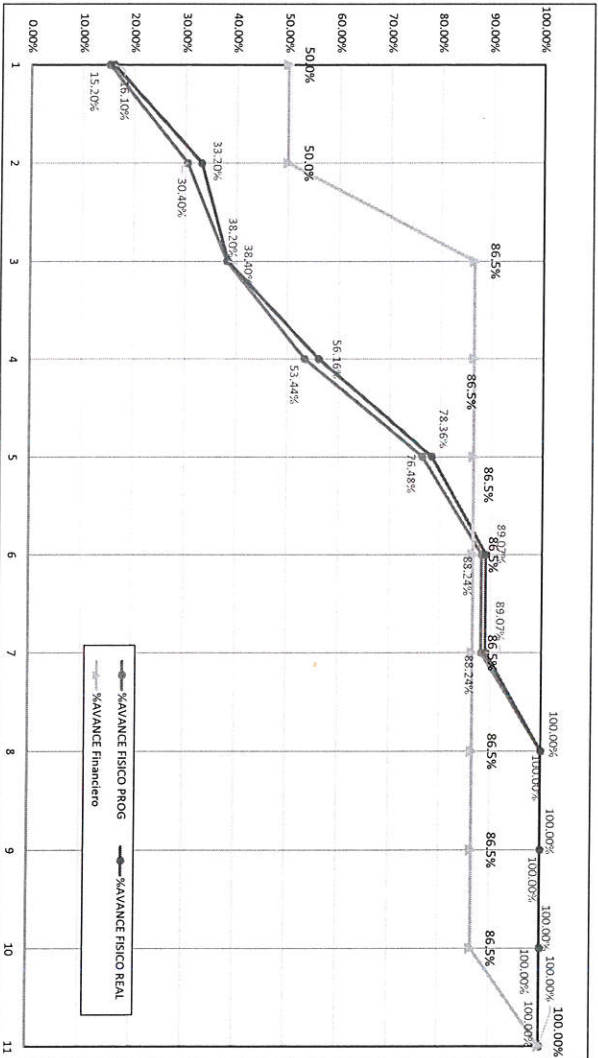

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

