


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF-11-028 CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CUARTO DORMITORIO Y BANO

Ubicación: DELEGACIONES, PUERTOERTO DE LA VIRGEN Y LA ESCONDIRA, COMUNIDADES,
 1.A CONCEPCION ESTACION EL CHIRALOTE, LA GUAYANA Y MATARON, 1. COMF7
 Tipo de Inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
 DEL DISTRITO FEDERAL 2021
 Programa: S.H. VIVIENDA DIGNA
 Subprograma: 02 AMPLIACION DE VIVIENDA
 Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: FISMDF 028/2021
 Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOWE, S.A. DE C.V.
 Inicio Vigente: miércoles, 3 de noviembre de 2021
 Inicio Real: miércoles, 3 de noviembre de 2021
 Fin Vigente: viernes, 17 de diciembre de 2021
 Fin Real: viernes, 17 de diciembre de 2021
 Dias de Obra: 45 dias
 Monto Contratado: \$1,189,059.43
 Monto Ejecido: \$1,189,059.43

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	03/11/2021	14.30%	15.12%	50.0%
2	10/11/2021	28.58%	30.11%	50.0%
3	17/11/2021	40.32%	42.30%	50.0%
4	24/11/2021	50.12%	50.50%	50.0%
5	01/12/2021	80.68%	81.71%	50.0%
6	08/12/2021	91.13%	92.60%	50.0%
7	15/12/2021	91.13%	92.60%	50.0%
8	22/12/2021	100.00%	100.00%	100.0%
9	29/12/2021	100.00%	100.00%	100.0%
10	05/01/2022	100.00%	100.00%	100.0%
11	12/01/2022	100.00%	100.00%	100.00%

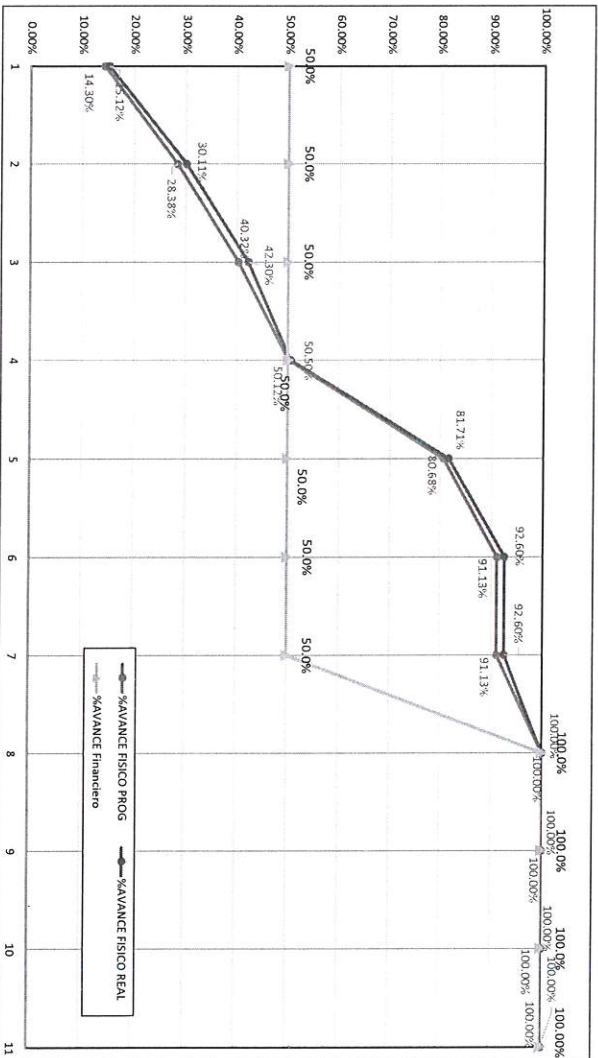

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

