


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF-11-029 CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CUARTO DORMITORIO Y BAÑO

Ubicación: LORETTO CHARCO DEL TORO
 Tipo de Inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021
 Programa: S.H. VIVIENDA DIGNA
 Subprograma: 02 AMPLIACION DE VIVIENDA
 Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: FISMDF 029/2021
 Contratista: BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
 Inicio Vigente: miércoles, 3 de noviembre de 2021
 Inicio Real: miércoles, 3 de noviembre de 2021
 Fin Vigente: viernes, 17 de diciembre de 2021
 Fin Real: viernes, 17 de diciembre de 2021
 Dias de Obra: 45 días
 Monto Contratado: \$1,364,162.23
 Monto Ejecutado: \$1,364,162.23

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 03/11/2021 | 15.20% | 15.40% | 50.0% |
| 2 | 10/11/2021 | 32.29% | 34.12% | 50.0% |
| 3 | 17/11/2021 | 45.13% | 47.14% | 50.0% |
| 4 | 24/11/2021 | 51.12% | 56.54% | 50.0% |
| 5 | 01/12/2021 | 84.01% | 85.12% | 50.0% |
| 6 | 08/12/2021 | 91.02% | 95.25% | 50.0% |
| 7 | 15/12/2021 | 93.20% | 97.50% | 50.0% |
| 8 | 22/12/2021 | 100.00% | 100.00% | 100.0% |
| 9 | 29/12/2021 | 100.00% | 100.00% | 100.0% |
| 10 | 05/01/2022 | 100.00% | 100.00% | 100.0% |
| 11 | 12/01/2022 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

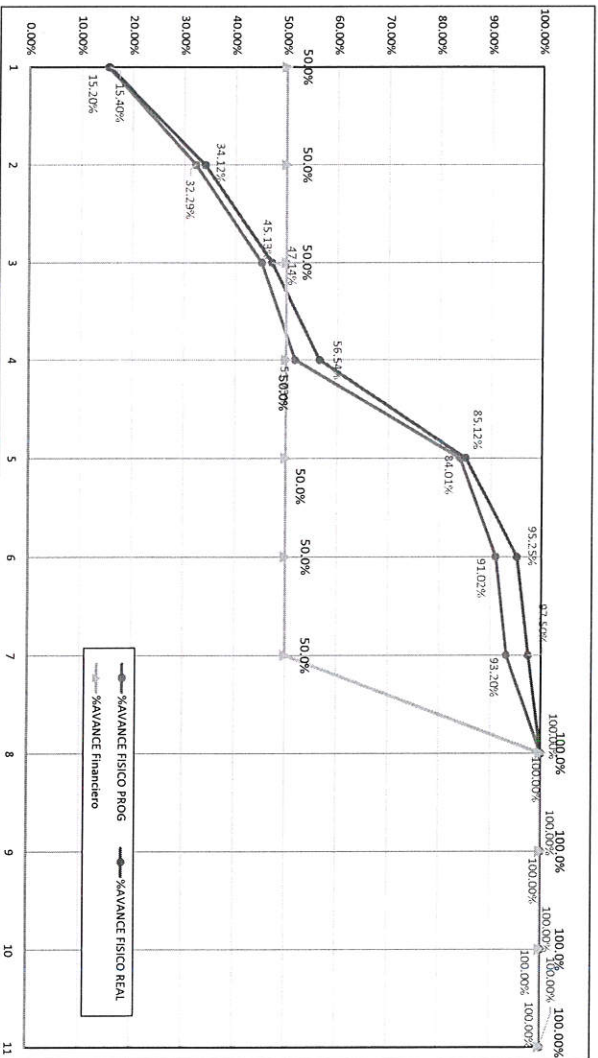

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

11
