

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FISMDF 11-030 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SUR**

Ubicación: **EL CHICALOTE, EX. VIÑEDOS DE GUADALUPE, FRACC. LA RIBERA, FRACC. EL CARONAL, LA GUAYANA, LORETO, MACARIO J GOMEZ Y PUERTICO DE LA VIRGEN**

Contrato: **FISMDF 030/2021**

Tipo de Inversión: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021**

Contratista: **DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Programa: **S.H. VIVIENDA DIGNA**

Inicio Vigente: **miércoles, 3 de noviembre de 2021**

Días de Obra: **45 días**

Subprograma: **03 CONSTRUCCION**


Fin Vigente: **viernes, 17 de diciembre de 2021**

Monto Contratado: **\$1,077,774.78**

Fin Real: **viernes, 17 de diciembre de 2021**

Monto Ejercido: **\$1,077,774.78**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	03/11/2021	12.20%	15.40%	50.0%
2	10/11/2021	30.36%	32.17%	50.0%
3	17/11/2021	42.17%	47.14%	50.0%
4	24/11/2021	50.74%	56.54%	50.0%
5	01/12/2021	82.45%	85.12%	50.0%
6	08/12/2021	90.21%	95.25%	70.2%
7	15/12/2021	91.57%	97.50%	70.2%
8	22/12/2021	100.00%	100.00%	70.2%
9	29/12/2021	100.00%	100.00%	70.2%
10	05/01/2022	100.00%	100.00%	100.0%
11	12/01/2022	100.00%	100.00%	100.00%

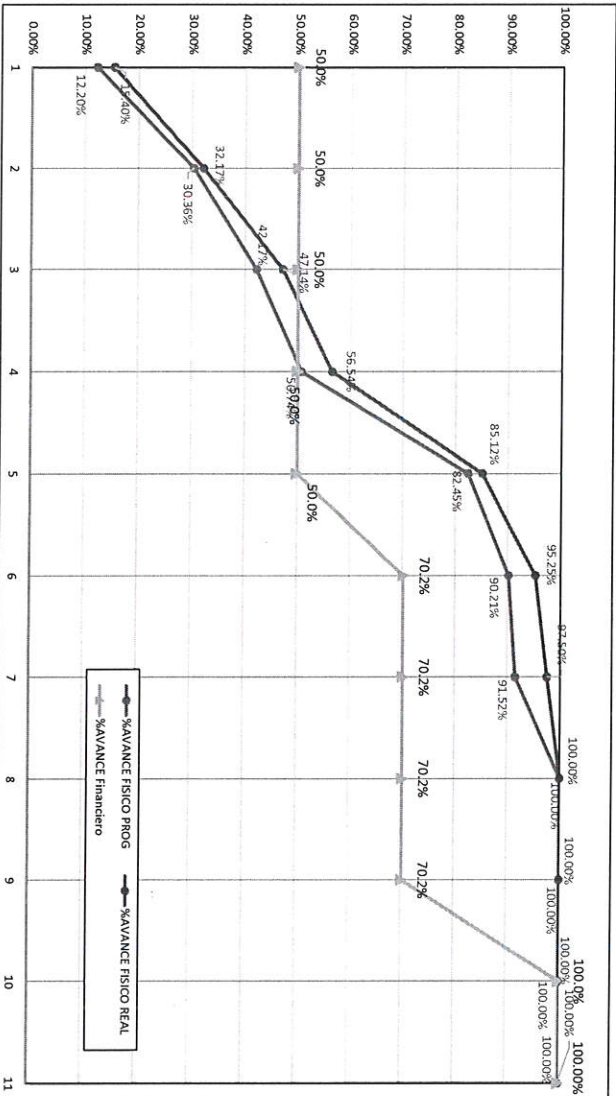

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Miguel Ángel
