

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMD# 11-031 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES NORTE-CENTRO.

Ubicación: AMAPOLAS DEL RIO, BORROTES, COL 28 DE ABRIL, COL. FRATERNIDAD, COL. OJO DE AGUA DEL MEZ, EL TEPETATE, FRACC. SAN JOSE DEL BARRANCO, FRECC. SANTA BARBARA, FRACC. LOS CEDROS, FRACC. EL HIDALGO, FRACC. LOS LIRIOS, FRACC. REVOLUCION, FRACC. SAN JOSE DE BUENA VISTA

Contrato: FISMD# 031/2021

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

Contratista: CORPORATIVO NEODENERGIA, S. DE R.L. DE C.V.

Programa: S.H. VIVIENDA DIGNA

Inicio Vigente: miércoles, 3 de noviembre de 2021

Días de Obra: 45 días

Subprograma: 03 CONSTRUCCION

Inicio Reel: miércoles, 3 de noviembre de 2021

Monto Contratado: \$888,967.16


Residente: ARQ. MIGUEL ANGEL CASTORENA ARIAS

Fin Vigente: viernes, 17 de diciembre de 2021

Monto Ejercido: \$888,967.16

Fin Reel: viernes, 17 de diciembre de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	03/11/2021	1.47%	2.80%	50.0%
2	10/11/2021	10.28%	12.80%	50.0%
3	17/11/2021	29.21%	32.50%	50.0%
4	24/11/2021	57.45%	60.00%	50.0%
5	01/12/2021	79.76%	80.00%	50.0%
6	08/12/2021	97.03%	98.00%	70.2%
7	15/12/2021	98.01%	98.50%	70.2%
8	22/12/2021	100.00%	100.00%	70.2%
9	29/12/2021	100.00%	100.00%	70.2%
10	05/01/2022	100.00%	100.00%	100.0%
11	12/01/2022	100.00%	100.00%	100.0%

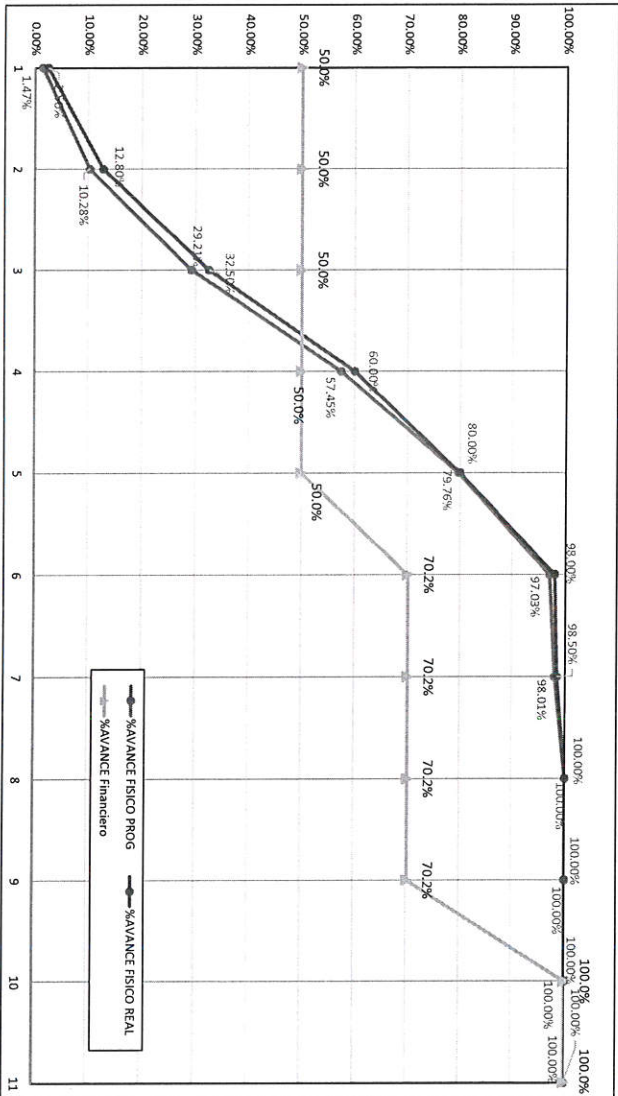

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Miguel Angel
