

Obra: FR 001/21 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EZQUIO RAMÍREZ

Ubicación: LOREITTO

Tipo de Inversión: RESARCITORIO REMANENTE 2020 - RESARCITORIO 2021

Programa: SF. SE PAVIMENTO EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACIÓN

Subprograma: 01. 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

**GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA**

Contrato: FR 001/2021

Contratista: TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: miércoles, 18 de agosto de 2021

Inicio Reel: miércoles, 18 de agosto de 2021

Fin Vigente: viernes, 1 de octubre de 2021


Fin Reel: viernes, 1 de octubre de 2021

Días de Obra: 45 días

Monto Contratado: \$ 1,183,849.00

Monto Ejercido: \$ 1,183,849.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	23/08/2021	38.37%	44.00%	50.0%
2	30/08/2021	76.75%	85.00%	50.0%
3	13/09/2021	89.52%	92.00%	50.0%
4	27/09/2021	95.00%	97.00%	64.1%
5	11/10/2021	100.00%	100.00%	64.1%
6	25/10/2021	100.00%	100.00%	64.1%
7	09/11/2021	100.00%	100.00%	100.0%

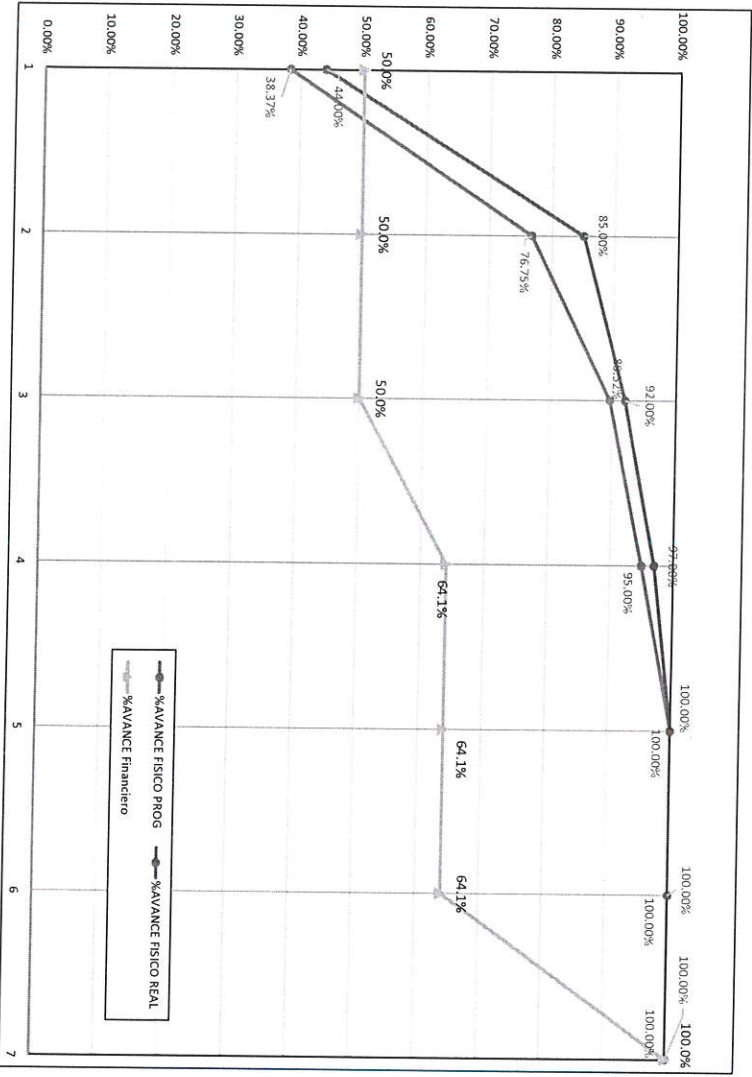

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
