

Obra: FR 002/21 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA

Ubicación: LORETTO

Tipo de inversión: RESARCITORIO 2021

Programa: SF, SE PAVIMENTO EN COLONIAS POPULARES, URBANIZACION

Subprograma: 01, 03 CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

Residente: ING. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

**GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA**

Contrato: FR 002/2021

Contratista: AZAEL JARIB CONDOVA HUERTA

Inicio Vigente: viernes, 1 de octubre de 2021

Inicio Real: viernes, 1 de octubre de 2021

Fin Vigente: domingo, 14 de noviembre de 2021


Fin Real: domingo, 14 de noviembre de 2021

Días de Obra: 45 días

Monto Contratado: \$ 1,560,104.00

Monto Ejercido: \$ 1,560,104.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	04/10/2021	12.00%	16.42%	50.0%
2	11/10/2021	32.00%	35.15%	50.0%
3	28/10/2021	41.00%	46.24%	50.0%
4	08/11/2021	65.00%	71.23%	74.1%
5	12/11/2021	79.00%	83.00%	74.1%
6	16/11/2021	100.00%	100.00%	74.1%
7	20/11/2021	100.00%	100.00%	74.1%
8	24/11/2021	100.00%	100.00%	74.1%
9	28/11/2021	100.00%	100.00%	74.1%
10	02/12/2021	100.00%	100.00%	74.1%
11	06/12/2021	100.00%	100.00%	74.1%
12	10/12/2021	100.00%	100.00%	74.1%
13	14/12/2021	100.00%	100.00%	100.0%

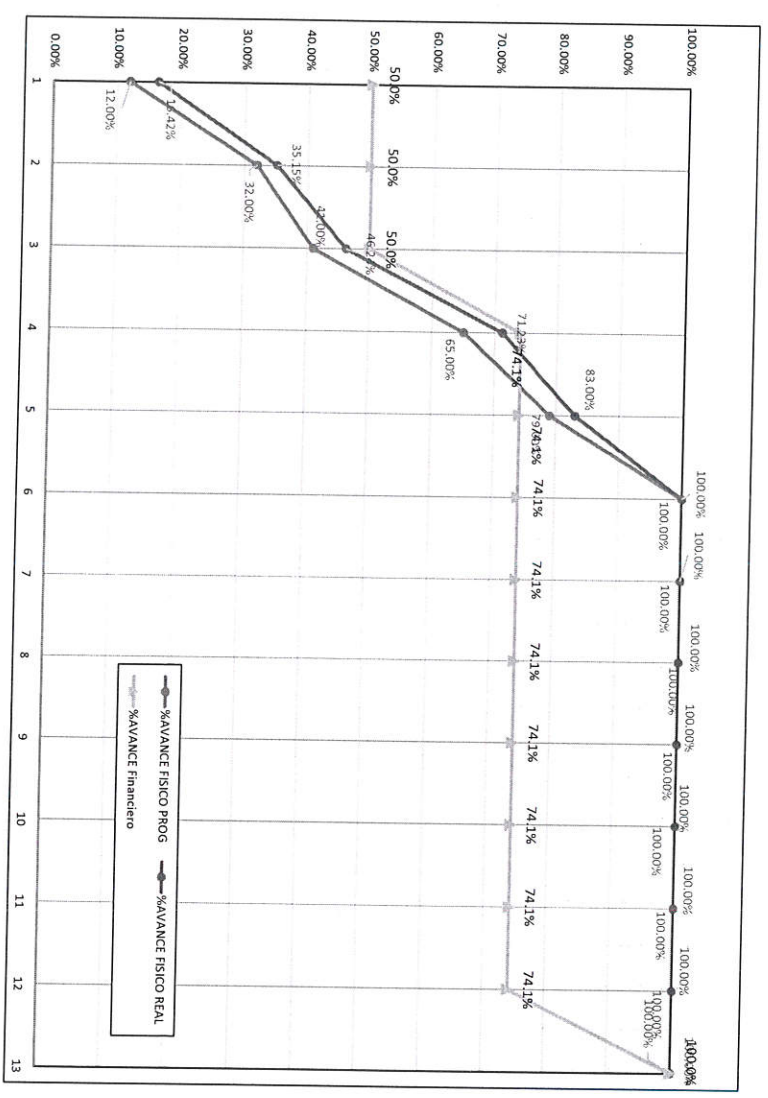

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
