

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFR 003/2021 REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE PASSEOS DE LA PROVINCIA

Ubicación: FRACCC. PASSEOS DE LA PROVINCIA  
 Tipo de Inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2020

Programa: SE URBANIZACIÓN

Subprograma: 07 o) PARQUES PÚBLICOS Y RECREATIVOS – REHABILITACIÓN  
 Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: PFR 003/2021  
 Contratista: SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALES ROOT, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: viernes, 28 de mayo de 2021

Fin Vigente: domingo, 11 de julio de 2021


Fin Real: domingo, 11 de julio de 2021

Días de Obra: 45 días

Monto Contratado: \$ 1,446,530.00

Monto Ejercido: \$ 1,446,530.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/05/2021	1.50%	3.00%	50.0%
2	07/06/2021	22.80%	25.00%	50.0%
3	14/06/2021	35.05%	38.00%	50.0%
4	21/06/2021	44.23%	45.00%	50.0%
5	28/06/2021	62.51%	65.00%	50.0%
6	05/07/2021	89.33%	90.00%	76.2%
7	12/07/2021	100.00%	100.00%	76.2%
8	19/07/2021	100.00%	100.00%	76.2%
9	26/07/2021	100.00%	100.00%	98.2%
10	02/08/2021	100.00%	100.00%	98.2%
11	09/08/2021	100.00%	100.00%	100.0%

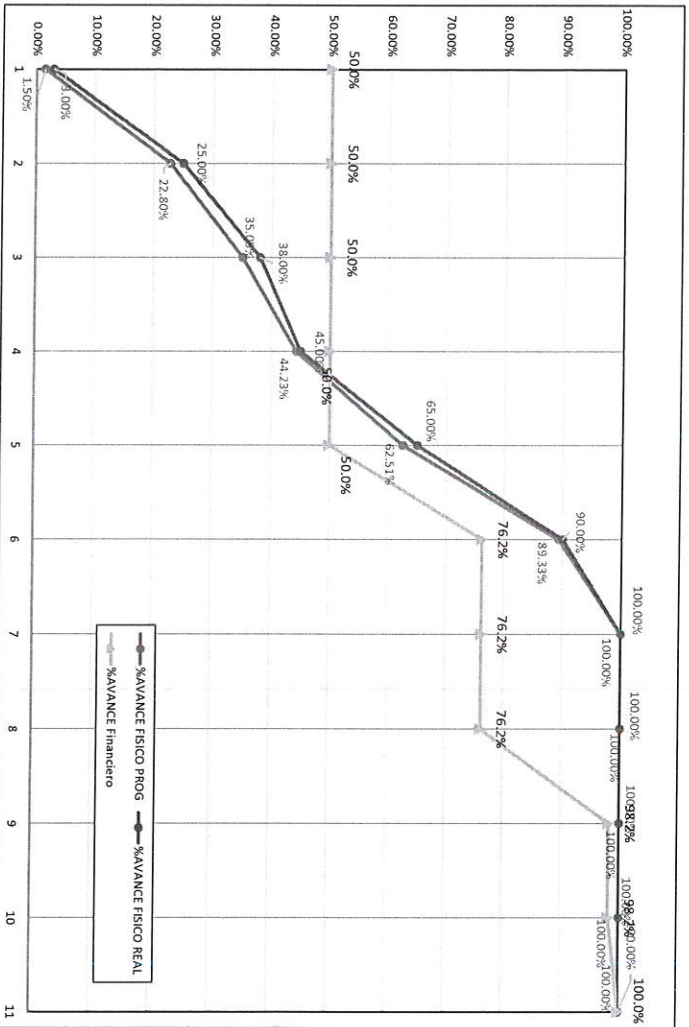

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
