

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFR 004/2021 REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE RECREATIVO LORETTTO

Ubicación: LORETTTO

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2020

Programa: SE URBANIZACIÓN

Subprograma: 07 d) PARQUES PÚBLICOS Y RECREATIVOS - REHABILITACIÓN

Residente: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: PFR 004/2021

Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: lunes, 24 de mayo de 2021

Inicio Reel: lunes, 24 de mayo de 2021

Fin Vigente: miércoles, 7 de julio de 2021


Fin Reel: miércoles, 7 de julio de 2021

Días de Obra: 45 días

Monto Contratado: \$ 1,479,110.00

Monto Ejercido: \$ 1,479,110.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FÍSICO PROG	%AVANCE FÍSICO REAL	%AVANCE Financiero
1	31/05/2021	9.09%	10.00%	50.0%
2	07/06/2021	25.87%	28.00%	50.0%
3	14/06/2021	41.41%	45.00%	57.6%
4	21/06/2021	55.76%	58.00%	57.6%
5	28/06/2021	68.37%	70.00%	76.2%
6	05/07/2021	92.16%	96.00%	76.2%
7	12/07/2021	100.00%	100.00%	76.2%
8	19/07/2021	100.00%	100.00%	76.2%
9	26/07/2021	100.00%	100.00%	76.2%
10	02/08/2021	100.00%	100.00%	76.2%
11	09/08/2021	100.00%	100.00%	100.0%

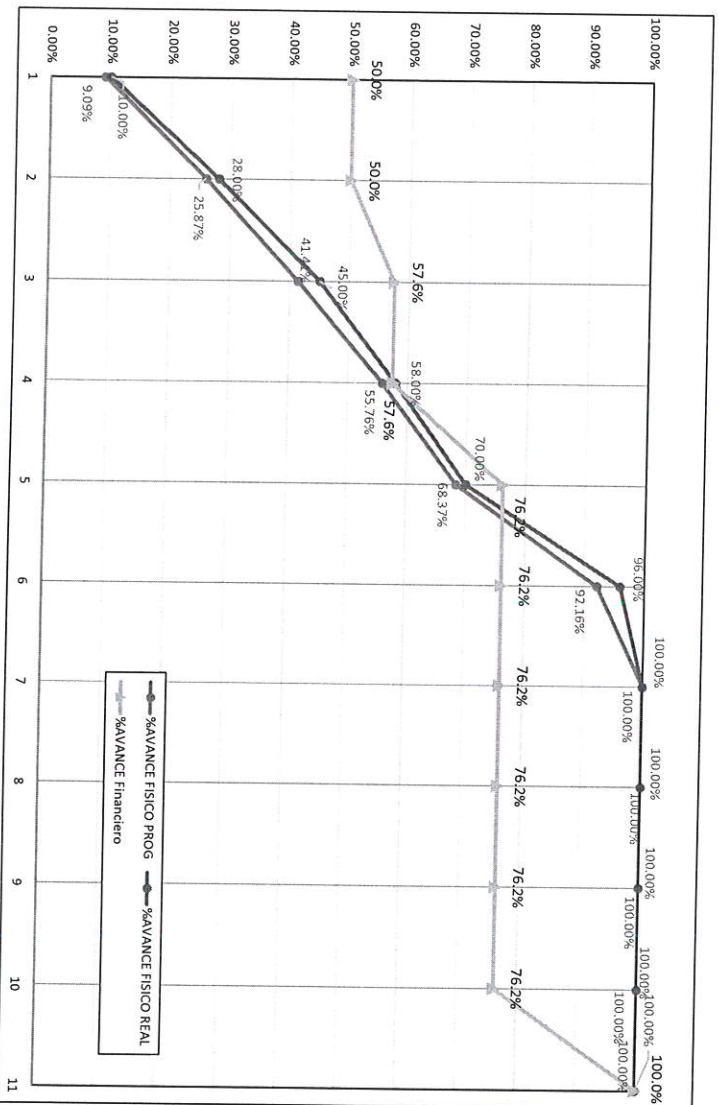

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
