


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF-11-018 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CALLE EZQUIO RAMIREZ A LAZARO CARDENAS
 FISMDF-11-019 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CALLE EZQUIO RAMIREZ A LAZARO CARDENAS

Ubicación: LORETTTO
 Tipo de Inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021
 Programa: SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE
 Subprograma: 01 REHABILITACIÓN
 Residente: ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contrato: FISMDF-018-019/2021
 Contratista: CONSTRUCTURA, S.A. DE CV.
 Inicio Vigente: Lunes, 7 de junio de 2021
 Inicio Real: Lunes, 7 de junio de 2021
 Fin Vigente: miércoles, 21 de julio de 2021
 Fin Real: miércoles, 21 de julio de 2021
 Dias de Obra: 45 días
 Monto Contratado: \$642,147.00
 Monto Ejecido: \$642,147.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/06/2021	7.50%	8.00%	50.0%
2	21/06/2021	38.14%	40.00%	50.0%
3	28/06/2021	54.02%	55.00%	50.0%
4	05/07/2021	68.86%	69.00%	50.0%
5	12/07/2021	79.42%	80.00%	50.0%
6	19/07/2021	88.16%	89.00%	66.7%
7	26/07/2021	100.00%	100.00%	66.7%
8	02/08/2021	100.00%	100.00%	77.2%
9	09/08/2021	100.00%	100.00%	77.2%
10	16/08/2021	100.00%	100.00%	77.2%
11	23/08/2021	100.00%	100.00%	100.0%

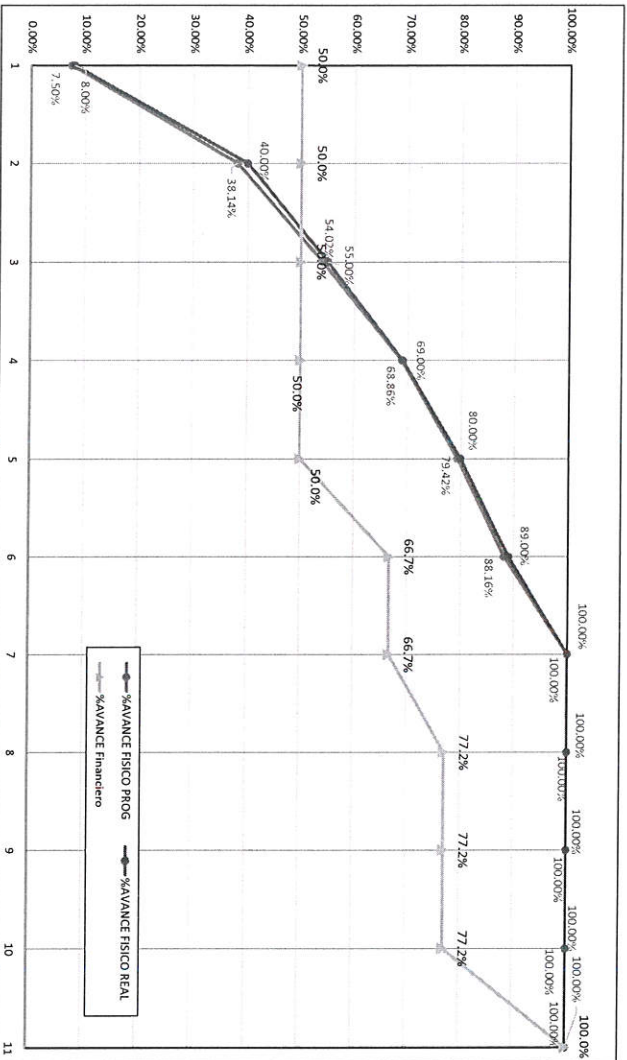

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
