


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISUDF 11-024 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FELIPE RODRIGUEZ, TRAMO AV. REBECA RODRIGUEZ RECIO A LA ESCUELA FISUDF 11-025 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE FELIPE RODRIGUEZ, TRAMO AV. REBECA RODRIGUEZ RECIO A LA ESCUELA

Ubicación: VIÑEDOS RIBIER
 Tipo de Inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021
 Programa: SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE
 Subprograma: 01 REHABILITACION
 Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: FISUDF 024-025/2021
 Contralista: BENJAMIN MACIAS GASPARR
 Inicio Vigente: Lunes, 7 de junio de 2021
 Inicio Real: Lunes, 7 de junio de 2021
 Fin Vigente: miércoles, 21 de julio de 2021
 Fin Real: miércoles, 21 de julio de 2021
 Dias de Obra: 45 dias
 Monto Contratado: \$471,886.00
 Monto Ejecido: \$471,886.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/06/2021	1.47%	2.50%	50.0%
2	21/06/2021	10.28%	12.80%	50.0%
3	28/06/2021	29.21%	32.50%	86.5%
4	05/07/2021	57.45%	60.00%	86.5%
5	12/07/2021	79.76%	80.00%	86.5%
6	19/07/2021	97.03%	98.00%	86.5%
7	26/07/2021	100.00%	100.00%	86.5%
8	02/08/2021	100.00%	100.00%	86.5%
9	09/08/2021	100.00%	100.00%	86.5%
10	16/08/2021	100.00%	100.00%	86.5%
11	23/08/2021	100.00%	100.00%	100.00%

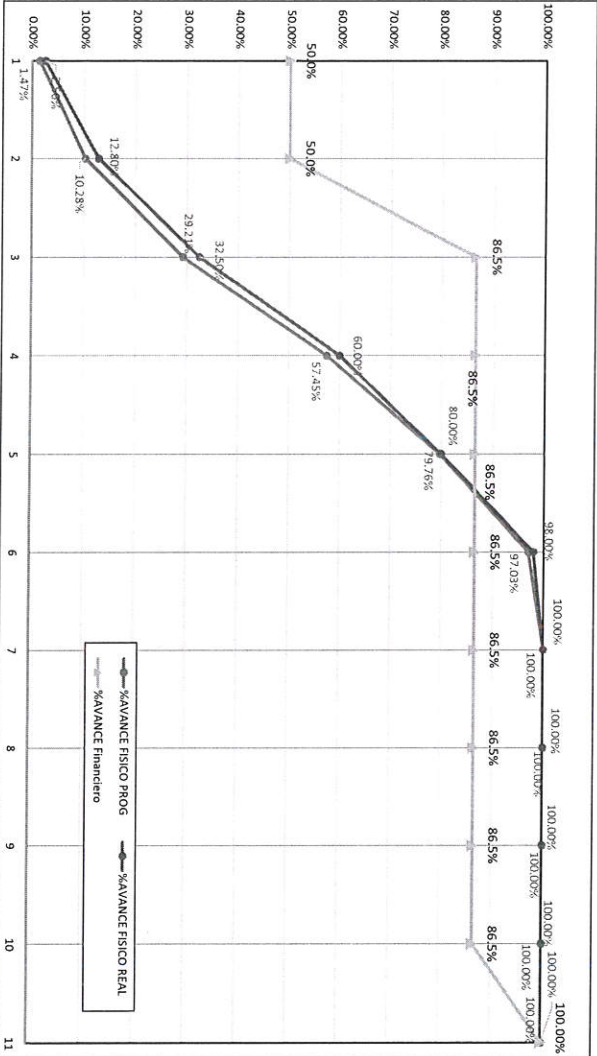

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Handwritten signature or mark in blue ink.
