

Obra:

FR 004/2021 ADECUACIÓN DE OFICINA DE ENLACE PARA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Ubicación:

CABECERA MUNICIPAL

Contrato:

FR 004/2021

Tipo de inversión:

RESARCITORIO 2021

Contratista:

ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Programa:

DA EDIFICIOS PUBLICOS

Inicio Vigente:

lunes, 18 de octubre de 2021

Días de Obra:

15 días

Subprograma:

03 CONSTRUCCION

Inicio Real:

lunes, 18 de octubre de 2021

Monto Contratado:

\$ 485,000.00

Residente:

ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Fin Vigente:

lunes, 1 de noviembre de 2021


Monto Ejercido:

\$ 485,000.00

Fin Real:

lunes, 1 de noviembre de 2021

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	24/10/2021	16.98%	20.30%	0.0%
2	31/10/2021	72.32%	74.60%	0.0%
3	07/11/2021	100.00%	100.00%	0.0%
4	14/11/2021	100.00%	100.00%	0.0%
5	21/11/2021	100.00%	100.00%	81.3%
6	28/11/2021	100.00%	100.00%	81.3%
7	05/12/2021	100.00%	100.00%	100.0%

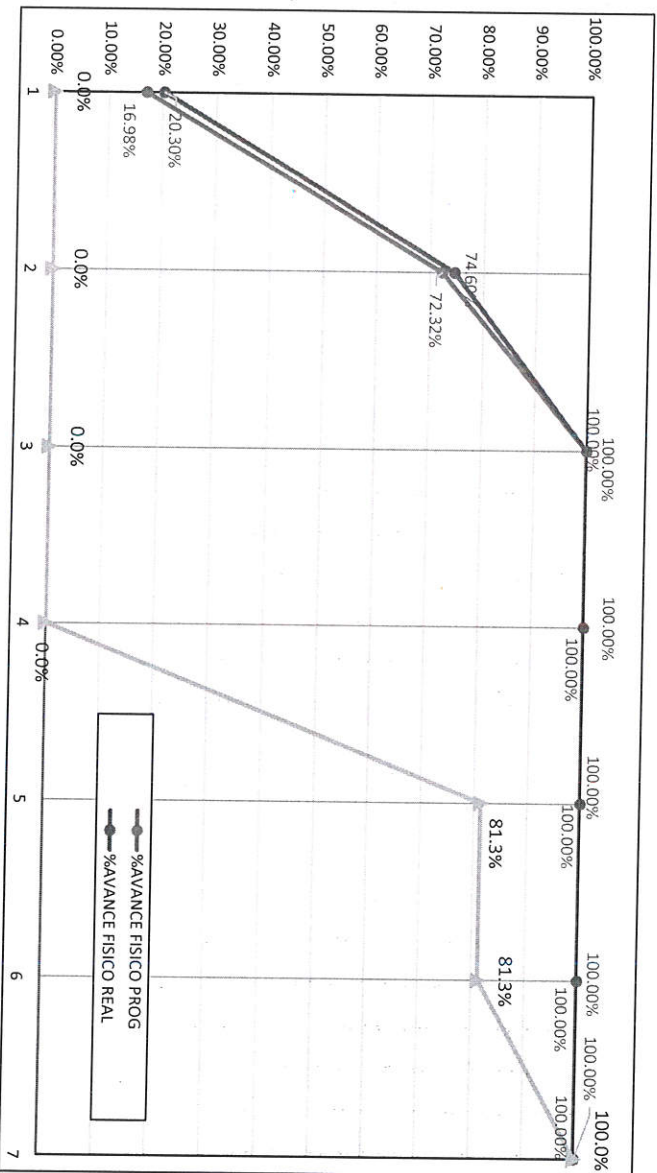

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
