

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FORTAMUN 001/2021 REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL

Contrato: FORTAMUN 001/2021

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Contratista: GGM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Programa: DA EDIFICIOS PUBLICOS

Inicio Vigente: domingo, 16 de diciembre de 2012

Días de Obra: 10 días

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Inicio Real: domingo, 16 de diciembre de 2012

Monto Contratado: \$702,506.51


Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Fin Vigente: miércoles, 26 de diciembre de 2012

Monto Ejercido: \$702,506.51

Fin Real: miércoles, 26 de diciembre de 2012

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	22/12/2012	43.21%	55.62%	0.0%
2	29/12/2012	100.00%	100.00%	0.0%
3	05/01/2013	100.00%	100.00%	100.0%

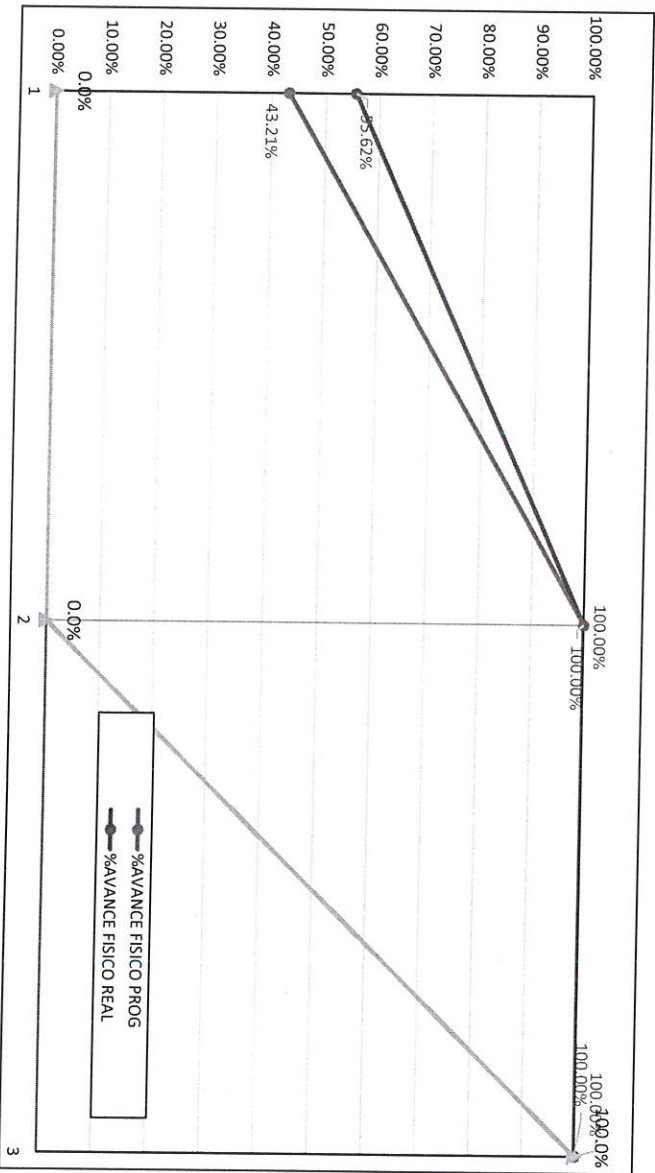

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
